



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES PROJETS/PROGRAMMES

*"J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis"
"I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe"*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


EXERCICE 2021

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
REGION DE L'EXTREME-NORD				
1	Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, phase II	3	111 900 000	3
REGION DU CENTRE				
2	C2D Capitales Régionales	7	43 180 397 708	5
3	C2D Education	9	1 445 147 937	6
4	C2D-Centre de Formation aux Métiers	1	87 500 000	7
5	C2D-Centre de Formation Professionnel Sectoriel	1	100 000 000	8
6	Cellule des Projets Routiers à Financements Conjoints	60	33 006 343 968	9
7	Cellule d'Exécution des Projets Santé-BID	5	355 123 000	16
8	Central African Backbone	26	10 768 531 354	17
9	Filets Sociaux	8	918 749 000	20
10	Programme Agropoles	4	84 500 000	21
11	Programme D'Aménagement et de Développement Intégré de la Boucle Minière Du Dja et de la Zone Frontalière Adjacente	15	4 180 000 000	22
12	Programme d'Appui à la Formation Professionnelle	1	35 000 000	24
13	Programme de Consolidation et de Pérennisation du Conseil Agropastoral	6	1 200 000 000	25
14	Programme de Décentralisation FEICOM Villes Moyennes	5	1 746 278 752	26
15	Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des Jeunes	56	2 364 433 006	27
16	Programme de Transformation et Valorisation des Produits Agricoles Volet Centre De Formation aux Métiers	6	2 338 600 000	32
17	Programme de Transformation et Valorisation des Produits Agricoles Volet Stratégie Nationale de la Finance Inclusive	2	752 000 000	33
18	Programme National de Lutte contre la Tuberculose	17	890 893 686	34
19	Programme National de Lutte contre le Paludisme	16	6 031 775 461	36
20	Projet d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga	8	77 531 302 268	37
21	Projet d'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun	20	1 183 490 000	38
22	Projet d'amélioration de l'Efficacité de La dépense Publique et du système Statistique	56	3 817 729 700	40
23	Projet d'Approvisionnement en Eau Potable de 07 Centres Pilotes	1	15 000 000	45
24	Projet d'Appui à la Modernisation et du Climat Des Affaires	2	936 272 288	46
25	Projet d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun	18	7 213 071 568	47
26	Projet d'Appui à la Scolarisation dans les Zones d'Education Prioritaires	1	443 500 000	49
27	Projet d'Appui au Développement du Cacao	4	200 000 000	50
28	Projet d'Assainissement de Yaoundé Phase II	9	2 011 013 276	51
29	Projet d'Assistance Technique pour le Développement de l'Hydroélectricité sur le Fleuve Sanaga	9	2 740 812 000	52
30	Projet de Développement de la Commercialisation de Bétails et des Infrastructures d'Elevage	11	2 250 773 240	53
31	Projet de Développement de l'Elevage	65	5 591 685 754	54
32	Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes	48	44 348 974 850	60
33	Projet de Développement du Secteur des Transports	37	18 611 089 872	65
34	Projet de l'enseignement Secondaire Technique	7	1 512 891 536	69
35	Projet de Renforcement des Capacités dans le Secteur Minier	9	1 050 205 984	70
36	Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution	6	2 648 000 000	71
37	Projet d'Electrification Rurale (Phase II)	4	19 140 904 906	72
38	Projet d'investissement et de Développement des Marchés Agricoles	9	359 275 290	73
39	Stade C2D	15	925 000 000	74
REGION DU SUD-OUEST				
40	Agricultural Infrastructure and Value Chain for Development Project	22	14 257 990 805	77
TOTAL		609	316 386 157 209	



REGION DE L'EXTREME-NORD

PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II (PDRI CL)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Amélioration de la race (Programme d'insémination artificielle des vaches/génisses)	SPI	45 000 000	PDRI-CL/CIPM	AONO	05/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/08/2021
2	Appui en semences de cultures fourragères, provendes pour poissons et tourteaux de coton pour bovins	AG	34 900 000	PDRI-CL/CIPM	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/07/2021
3	Travaux de réhabilitation de la base vie (Phase II)	BEC	32 000 000	PDRI-CL/CIPM	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
TOTAL			111 900 000							

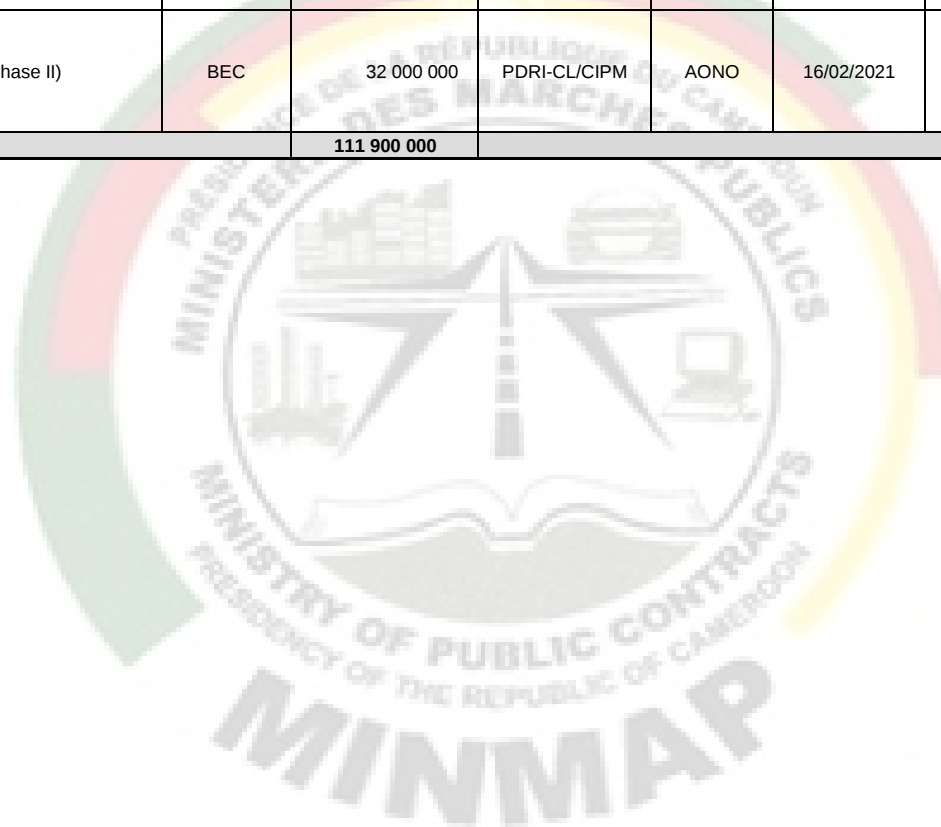



REGION DU CENTRE

C2D CAPITALES REGIONALES										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Equipements divers à Maroua	BEC	2 146 499 968	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	26/02/2021	28/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	22/09/2022
2	Infrastructures (voiries et assainissement) Maroua	ROUTES	17 853 499 392	MINHDU/CIPM-CCCM(Routes)	AOIR	26/02/2021	02/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	29/12/2023
3	Equipements divers à Bamenda	BEC	3 706 289 920	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	10/09/2021	10/12/2021	17/01/2022	31/01/2022	12/09/2023
4	Infrastructures (voiries et assainissement) Bamenda	ROUTES	16 293 709 824	MINHDU/CIPM-CCCM(Routes)	AOIR	25/01/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	23/11/2023
5	Contrôle des travaux des infrastructures et équipements divers	SPI	1 188 999 936	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AOIR	22/03/2021	26/07/2021	30/08/2021	13/09/2021	25/03/2024
6	Recrutement d'un consultant architecte (Contrôle) Bamenda et Maroua	SPI	17 887 500	MINHDU/CIPM	DC			22/04/2021	06/05/2021	06/05/2022
7	Assistance technique à maîtrise d'ouvrage (AMO) Yaoundé	SPI	1 973 511 168	MINHDU/CIPM / CCCM	GG			05/01/2021	21/01/2021	23/12/2024
TOTAL			43 180 397 708							

C2D EDUCATION										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du MFOUNDI, MEFOU et AFAMBA et LEKIE, Région du Centre	AG	95 736 285	MINEDUB/CIPM	AONO	23/03/2021	11/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	28/01/2022
2	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du DIAMARE, MAYO SAVA et LOGONE et CHARI, Région de l'Extrême-Nord	AG	566 697 764	MINEDUB/CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/05/2021	09/08/2021	13/09/2021	27/09/2021	25/03/2022
3	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements de la VINA, Région de l'Adamaoua	AG	55 428 593	MINEDUB/CIPM	AONO	20/04/2021	09/07/2021	16/08/2021	30/08/2021	25/02/2022
4	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du HAUT-NYONG, LOM ET DJEREM, BOUMBA et NGOKO, KADEY, Région de l'Est	AG	168 634 407	MINEDUB/CIPM	AONO	12/04/2021	02/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	18/02/2022
5	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques des départements du FARO et du MAYO LOUTI, Région du Nord	AG	163 642 601	MINEDUB/CIPM	AONO	20/04/2021	09/07/2021	16/08/2021	30/08/2021	25/02/2022
6	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans le WOURI et le MOUNGO, Région du Littoral	AG	80 785 316	MINEDUB/CIPM	AONO	19/03/2021	20/05/2021	21/06/2021	01/07/2021	27/12/2021
7	Achèvement des travaux de construction des infrastructures scolaires à l'Ecole Publique de LOUGGUEO et au Groupe Scolaire de DJARENGOL KODEK, dans le département de la Diamaré, Région de l'Extrême-Nord	BEC	249 572 971	MINEDUB/CIPM	AONO	08/03/2021	28/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	15/03/2022
8	Souscription d'une assurance maladie pour le personnel de l'UGSC et leur famille 2021-2022	SPI	19 650 000	MINEDUB/CIPM	AONR	22/06/2021	14/09/2021	18/10/2021	01/11/2021	01/11/2022
9	Consultants Individuels chargés du suivi de l'exécution des marchés de fabrication et de fourniture des tables bancs résiliés et à relancer	SPI	45 000 000	MINEDUB/CIPM	AONR	23/03/2021	15/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	28/01/2022
TOTAL			1 445 147 937							

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION AUX METIERS NON AGRICOLES EN MILIEU RURAL (C2D - CFM)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Branchement du CFM de Maroua au réseau ENEO	AI	87 500 000	MINEFOP/CIPM	AONO	12/07/2021	01/10/2021	08/11/2021	22/11/2021	21/02/2022
TOTAL			87 500 000							



PROJET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL (C2D CFPS)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Branchement du CFPS d'Edea au réseau ENEO	AI	100 000 000	MINEFOP/CIPM	AONO	28/06/2021	17/09/2021	25/10/2021	08/11/2021	07/02/2022
TOTAL			100 000 000							



CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPRFC)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Formation des populations aux premiers gestes de premiers secours	SPI	15 131 000	CPRFC/CSPM	QC			22/02/2021	08/03/2021	08/03/2021
2	Appui à l'élaboration d'un plan stratégique de communication sur la sécurité routière	SPI	14 300 000	CPRFC/CSPM	QC			22/02/2021	08/03/2021	07/05/2021
3	Appui à la production des projets de normes pour le secteur des routes (centre de visite techniques, accessoires d'entretien des véhicules, gestion des entreprises de transport)	SPI	150 000 000	CPRFC/CSPM/CC CM(SPI)	AONR	05/04/2021	09/07/2021	16/08/2021	30/08/2021	25/02/2022
4	Travaux connexes dans le cadre du projet d'aménagement de la route Mintom -Lélé-Ntam-Mbalam (Djoum),Lot1	ROUTES	393 473 056	CPRFC/CSPM	AONO	25/01/2021	16/04/2021	24/05/2021	07/06/2021	01/02/2022
5	Travaux connexes dans le cadre du projet d'aménagement de la route Mintom -Lélé-Ntam-Mbalam (Mintom 1),Lot 2		260 000 000							
6	Travaux connexes dans le cadre du projet d'aménagement de la route Mintom -Lélé-Ntam-Mbalam(Mintom 2),Lot 3		330 000 000							
7	Travaux connexes dans le cadre du projet d'aménagement de la route Mintom -Lélé-Ntam-Mbalam(Ntam 1),Lot 4		230 000 000							
8	Travaux connexes dans le cadre du projet d'aménagement de la route Mintom -Lélé-Ntam-Mbalam(Ntam 2),Lot 5		210 000 000							
9	Travaux connexes dans le cadre du projet d'aménagement de la route Mintom -Lélé-Ntam-Mbalam(Mintom et Ntam),Lot 6		305 000 000							

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPRFC)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Audit comptable et financier du projet de transport multi-modal exercice 2020	SPI	22 000 000	CPRFC/CSPM	QC			08/02/2021	22/02/2021	24/03/2021
11	Travaux de réhabilitation de la traversée de la ville Bamenda (Ecole de champion-agence de voyage amour mezam junction-vetenary junction-Hospital Round about -Foud market-city Chemist round about -veterinary junction, 12 km) y compris les routes secondaires	ROUTES	919 628 992	CPRFC/CSPM	QC			15/03/2021	29/03/2021	29/03/2021
12	Elaboration du rapport d'achèvement du Projet de Transport Multimodal	SPI	23 000 000	CPRFC/CSPM	QC			08/02/2021	22/02/2021	22/02/2021
13	travaux de plantation de 14000 arbres sur la section Maroua-Mora	SPI	174 000 000	CPRFC/CSPM/CC CM(SPI)	AONR	01/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/06/2022
14	CONTRAT RIDEV	SPI	355 826 528	CPRFC/CSPM	QC			16/02/2021	04/03/2021	04/03/2022
15	Appui à l'élaboration d'un plan stratégique de communication sur la sécurité routière.	SPI	14 300 000	CPRFC/CSPM	AONR		02/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
16	Formation des populations riveraines aux gestes de premiers secours	SPI	18 131 000	CPRFC/CSPM	AONR		01/02/2021	22/02/2021	08/03/2021	07/04/2021
17	Achat des véhicules et des radars pour la gendarmerie et la police.	AG	238 500 000	CPRFC/CSPM	AONO	29/01/2021	19/04/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
18	Accompagnement dans la mise en œuvre du MPGP, communication sociale du projet, suivi des VGB par une ONG	SPI	79 000 000	CPRFC/CSPM	QC			08/03/2021	22/03/2021	22/03/2022

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPRFC)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
19	Achat de six (06) radars pour la gendarmerie et la police.	AG	291 000 000	CPRFC/CSPM	AONO	05/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
20	Mise en place d'infrastructures socio-economiques complémentaires le long du tronçon de la route Babadjou-Matazem.	ROUTES	230 000 000	CPRFC/CSPM	AONR	12/02/2021	10/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/12/2021
21	Travaux de la route Matazem- Welcome Bamenda (Lot 2: 18km) y compris les routes secondaires	ROUTES	736 671 104	CPRFC/CSPM	QC			24/03/2021	08/04/2021	10/04/2023
22	Travaux de d'aménagement de la voie de contournement de la falaise de Bamenda	ROUTES	758 132 160	CPRFC/CSPM	QC			01/03/2021	15/03/2021	09/08/2022
23	Audit du contrat- PLAN ETAT/MATGENIE	SPI	75 000 000	CPRFC/CSPM	QC			24/02/2021	11/03/2021	09/07/2021
24	Etude faisabilité pour la création des agences d'urbanisme	SPI	95 000 000	CPRFC/CSPM	AONR		01/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	17/11/2021
25	Etude diagnostique du PAD	SPI	100 000 000	CPRFC/CSPM	QC			25/01/2021	08/02/2021	08/06/2021
26	Audit environnemental et social du PAST 1	SPI	20 000 000	CPRFC/CSPM	AONR		02/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	14/05/2021
27	Evaluation environnementale et sociale stratégique du secteur des transport	SPI	23 700 000	CPRFC/CSPM	AONR	12/02/2021	10/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/06/2022

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPRFC)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
28	Sensibilisation à la protection de l'environnement, de la sécurité routière à la prévention contre les MST et EBOLA.	SPI	62 776 000	CPRFC/CSPM	AONR	18/01/2021	12/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	15/05/2024
29	Elaboration de la stratégie nationale d'adaptation et de résilience des infrastructures de transport	SPI	49 500 000	CPRFC/CSPM	AONR		09/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/04/2022
30	Contrôle et surveillance des travaux de Constructions des infrastructures dédiées au genre(PAST 1)	SPI	150 000 000	CPRFC/CSPM/CC CM(SPI)	AONR	22/02/2021	28/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	16/05/2022
31	Travaux d'aménagement de 22 points d'eau type forages repartis en trois lots le long de la route Kumba - Mamfe	AI	262 227 968	CPRFC/CSPM	AONO	18/01/2021	09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	26/01/2022
32	Travaux d'aménagement de la route Ntui – Yoko – Lena: lot 2B (Ndjole-Mankim)	ROUTES	5 798 000 128	CPRFC/CSPM	AONO	01/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	21/06/2023
33	Construction des infrastructures dédiées au genre (PAST 1)	AI	600 000 000	CPRFC/CSPM	AONR	12/02/2021	10/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	22/02/2022
34	Travaux d'aménagement de la route Ntui – Yoko – Mankim (96,7km: lot 2A (Ntui-Ndjole), (Ndjole-Mankim)) Lot 2A et voiries urbaines à Ntui et Yoko	ROUTES	5 798 000 128	CPRFC/CSPM	AONO		25/01/2021	01/03/2021	15/03/2021	15/03/2023
35	Contrôle et surveillance des aménagements connexes aux travaux d'aménagement à la route KUMBA - MAMFE	SPI	293 341 952	CPRFC/CSPM	AONR	01/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	20/02/2023
36	Recrutement d'un Consultant en vue de l'Évaluation Sociale dans le cadre des activités du Programme d'Appui au Secteur des Transports Phaser 3. Bamenda -Bafut – Wum et Bamenda – Ndop - Babessi	SPI	70 000 000	CPRFC/CSPM	AONR	18/01/2021	12/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/07/2021

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPRFC)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
37	Acquisition des véhicules et biens au profit de la CSEPR/BAD.	AG	278 285 952	CPRFC/CSPM/CC CM(AG)	AONO	01/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	21/07/2021
38	Recrutement d'un Consultant en vue de l'Évaluation Sociale dans le cadre des activités du Programme d'Appui au Secteur des Transports Phase 3. Kumbo – Nkambe Misaje – Dumbo – Frontière Nigéria.	SPI	70 000 000	CPRFC/CSPM	AONR	01/02/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/08/2021
39	Recrutement d'un Consultant en vue de la Conception et Mise En Place d'un Centre Régional d'Excellence de Formation en Sécurité Routière à l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé	SPI	180 500 000	CPRFC/CSPM/CC CM(SPI)	AONR	01/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	26/09/2022
40	Maîtrise d'œuvre complète des travaux d'aménagement/ réhabilitation de la route Carrefour Bambui-Ndop-Babessi y compris la bretelle Babungo-Dawara (54 km) et de voirie urbaine à Bambui university, Ndop, Babessi et Jakiri.	SPI	178 052 192	CPRFC/CSPM/CC CM(SPI)	AONR	08/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	09/06/2026
41	Maîtrise d'œuvre complète des travaux d'aménagement/réhabilitation de la route Bamenda - Bafut -Wum (80 km) et de réhabilitation de voirie urbaine à Wum et Bafut	SPI	156 731 232	CPRFC/CSPM/CC CM(SPI)	AONR	08/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	09/06/2026
42	Maîtrise d'œuvre complète des travaux d'aménagement/réhabilitation de la route Misaje-Dumbo-frontière Nigéria (50 km) et réhabilitation de la voirie urbaine à Misaje.	SPI	125 000 000	CPRFC/CSPM	AONR	08/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	09/06/2026
43	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement/réhabilitation de la route Kumbo – Nkambe – Misaje et Maîtrise d'œuvre complète de la voie de contournement de la ville de Nkambe et de réhabilitation de la voirie urbaine à Kumbo, Ndu et Nkambe.	SPI	236 583 296	CPRFC/CSPM/CC CM(SPI)	AONR	01/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	06/10/2025
44	Étude sur la réforme du secteur routier au Cameroun	SPI	200 000 000	CPRFC/CSPM	AONR		12/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	26/01/2022
45	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement socio-économiques du Programme (PAST 2)	SPI	20 000 000	CPRFC/CSPM	AONR	08/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	14/01/2022

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPRFC)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
46	Étude des voiries structurantes prioritaires des villes de Bafoussam et Bamenda	SPI	100 000 000	CPRFC/CSPM	AONR		02/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/03/2022
47	Étude des voiries structurantes prioritaires de la Yaounde et douala	SPI	100 000 000	CPRFC/CSPM	AONR		26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	11/04/2022
48	Promotion des femmes et des jeunes à travers : la réalisation de mini adduction d'eau potable et de forages	AI	10 000 000	CPRFC/CSPM	AONO	18/01/2021	09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
49	Promotion des femmes et des jeunes à travers : la construction d'infrastructures marchandes	BEC	600 000 000	CPRFC/CSPM/CC CM/(BEC)	AONO	19/07/2021	18/10/2021	22/11/2021	06/12/2021	07/03/2022
50	Étude des voiries structurantes prioritaires de la ville de Maroua	SPI	100 000 000	CPRFC/CSPM/CC CM(SPI)	AONR	01/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	25/04/2022
51	Promotion des femmes et des jeunes à travers : la réhabilitation d'infrastructures sociales (écoles, centre de santé)	BEC	300 000 000	CPRFC/CSPM	AONO	06/07/2021	24/09/2021	01/11/2021	15/11/2021	14/02/2022
52	Audit Comptable et financier Djoum Mintom	SPI	32 490 000	CPRFC/CSPM	AONR	18/01/2021	12/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/06/2021
53	Promotion des femmes et des jeunes à travers : la réhabilitation et l'équipement de Centre de Promotion de la famille et de la Femme (PAST2)	BEC	149 820 000	CPRFC/CSPM	AONO	06/07/2021	24/09/2021	01/11/2021	15/11/2021	14/02/2022
54	Etudes d'aménagement de la route Mapé - Banyo - Tibati (190 km) et de réhabilitation de la route Tibati - Meidougou (232 km)	SPI	379 800 000	CPRFC/CSPM	AONR		15/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	26/12/2022


CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPRFC)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
55	Mise aux normes de la route Yaoundé – Sangmelima	SPI	198 742 144	CPRFC/CSPM	AONR			15/01/2021	29/01/2021	24/05/2022
56	Acquisition des kits agricoles et portes-tout pour les femmes	AG	59 400 000	CPRFC/CSPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
57	Travaux d'aménagement/réhabilitation du lot n°1. Kumbo-Nkambe (88 km).	ROUTES	6 310 299 136	CPRFC/CSPM/CC CM(ROUTES)	AONO	01/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/06/2024
58	Sensibilisation à la protection de l'environnement, à la sécurité routière, à la prévention contre les MST et l'EBOLA	SPI	35 000 000	CPRFC/CSPM	QC			25/01/2021	08/02/2021	08/02/2023
59	Sensibilisation des populations de la ZIP d'aménagement de la route Bogo-Pouss	SPI	20 000 000	CPRFC/CSPM	QC			25/01/2021	08/02/2021	08/02/2023
60	Travaux d'aménagement de la route Maroua- Bogo – Maga – Pouss. Section Bogo-Pouss y compris les voiries de certaines villes traversées (63,16 km au lieu de 93 km) + 13km de voirie	ROUTES	4 000 000 000	CPRFC/CSPM	AONO	18/01/2021		17/05/2021	31/05/2021	31/05/2023
TOTAL			33 006 343 968							

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE BID (CEPS BID)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Formation de 2000 agents de santé communautaire	SPI	50 000 000	CEPS BID/CSPM	AONR	08/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/09/2021
2	Recrutement d'un consultant pur la Conférence Nationale pour le renforcement du système de transfusion sanguine	SPI	30 123 000	CEPS BID/CSPM	AONR	08/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	09/08/2023
3	Fourniture des équipements des dortoirs de sages femme de Bertoua et de Maroua	AG	50 000 000	CEPS BID/CSPM	DC	15/02/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
4	Acquisition de deux (02) ambulances simples	AG	100 000 000	CEPS BID/CSPM	AONO	05/04/2021	25/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	15/11/2021
5	Acquisition de deux (02) ambulances 4X4	AG	125 000 000	CEPS BID/CSPM	AONO	05/04/2021	25/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	15/11/2021
TOTAL			355 123 000							

CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un Spécialiste en suivi/évaluation à l'Unité de Coordination du Projet Central African Backbone	SPI	18 000 000	CAB/CSPM	AOIR			30/03/2021	15/04/2021	11/04/2022
2	Elaboration et suivi de la mise en œuvre des outils techniques de gestion des archives de la CAMPOST-Suite	SPI	17 150 000	CAB/CSPM	AOIR		09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
3	Audit externe des comptes pour les exercices clos aux 31 Décembre 2019, 2020 et 2021	SPI	40 000 000	CAB/CSPM	AOIR		09/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
4	Etude d'Impact Environnemental et Social pour le tronçon additionnel de pose de la Fibre Optique	SPI	41 003 670	CAB/CSPM	AOIR	17/05/2021	07/09/2021	11/10/2021	25/10/2021	25/04/2022
5	Etude de faisabilité du projet de mise en place d'une bourse des matières premières agricole au Cameroun	SPI	196 788 448	CAB /CSPM - CCCM (SPI)	AOIR	05/02/2021	11/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	30/11/2021
6	Etude en vue du déploiement d'une plateforme de commerce électronique (E-Commerce) à la CAMPOST	SPI	208 267 300	CAB /CSPM - CCCM (SPI)	AOIR		22/02/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
7	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture, formation et installation d'une plateforme technique de formation sur les infrastructures optiques à l'école nationale supérieure des postes, des télécommunications et des TIC (SUP'PTIC)	SPI	50 000 000	CAB/CSPM	AOIR		19/03/2021	26/04/2021	10/05/2021	08/11/2021
8	Maitrise d'œuvre pour la fourniture, la formation et l'installation d'équipements solaires pour les centres communautaires (TCP, CEAC/DAA et CPFF) identifiés *	SPI	50 000 000	CAB/CSPM	AOIR			15/02/2021	01/03/2021	30/08/2021
9	Maitrise d'œuvre pour la Construction de bibliothèques spécialisées et aménagement de salles de classe sur les deux sites de SUP'PTIC (Yaoundé et Buéa)	SPI	20 000 000	CAB/CSPM	AOIR			19/03/2021	02/04/2021	29/09/2021
10	Audit technique de clôture du Projet	SPI	70 000 000	CAB/CSPM	AOIR	26/04/2021	17/08/2021	20/09/2021	04/10/2021	03/01/2022
11	Suivi - Evaluation - Gestion du savoir	SPI	130 792 000	CAB /CSPM - CCCM (SPI)	AONO	10/05/2021	13/09/2021	18/10/2021	01/11/2021	01/03/2022


CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d'un Technopôle Digital, d'un Datacenter et d'une plateforme CSIRT (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) / SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER) / PKI (PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE) au Cameroun	SPI	196 604 000	CAB /CSPM - CCCM (SPI)	AOIR	25/02/2021	02/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	21/02/2022
13	Etude de Faisabilité détaillée aux fins de la pose de la fibre optique sur certains tronçons de la Dorsale nationale à fibre optique	SPI	294 906 000	CAB /CSPM - CCCM (SPI)	AOIR	21/05/2021	24/09/2021	01/11/2021	15/11/2021	14/04/2022
14	Développement, installation des outils applicatifs, formation, support, et suivi - contrôle du déploiement des équipements pour le SIMC	SPI	533 594 000	CAB /CSPM - CCCM (SPI)	AOIR	15/02/2021	21/06/2021	26/07/2021	09/08/2021	07/02/2022
15	aménagement des centres communautaires retenus et des locaux devant abriter la coordination et les équipements du système d'information des marchés et climatique (SIMC) du MINADER	BEC	245 000 000	CAB/CSPM	AONO	26/03/2021	14/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	01/11/2021
16	Construction de bibliothèques spécialisées et aménagement de salles de classe sur les deux sites de SUP'PTIC (Yaoundé et Buea) **	BEC	238 181 000	CAB/CSPM	AONO	12/01/2021	09/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/10/2021
17	Construction des locaux techniques à la CAMTEL dans les localités de NGUTI et EKOK (REGION DU SUD-OUEST)	BEC	73 000 000	CAB/CSPM	AONO	22/03/2021	11/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	01/11/2021
18	Fourniture d'équipements informatiques et de matériel et de mobilier de bureau complémentaire à l'Unité de Coordination du Projet Central African Backbone	AG	40 335 000	CAB/CSPM	AONO	22/03/2021	11/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	01/09/2021
19	Fourniture et installation d'Equipements informatiques et bureautiques à l'Unité de Coordination du Projet Central African Backbone	AG	28 769 000	CAB/CSPM	AONO			31/12/2020	14/01/2021	15/02/2021
20	Fourniture, formation et installation d'une plateforme technique de formation sur les infrastructures optiques à l'Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des TIC (SUP'PTIC)	AG	918 762 000	CAB /CSPM - CCCM (AG)	AOIO		15/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	01/11/2021
21	Fourniture et installation d'équipements informatiques et bureautiques pour les TCP, CEAC et CPFF	AG	98 302 000	CAB/CSPM	AONO		15/02/2021	22/03/2021	05/04/2021	04/10/2021
22	Fourniture, Formation et Installation des Equipements Informatiques, Réseaux, d'Energie, de Sécurité Incendie, de bureau (mobilier) et de Collecte, de Traitement et de Diffusion de Données pour la mise en place du système d'information de marches et climatique (SIMC	AG	1 808 580 000	CAB /CSPM - CCCM (SPI)	AONO		26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	09/02/2022

CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Fourniture, formation et installation des systèmes d'énergie et de climatisation dans le cadre des travaux de pose de la fibre optique du projet CAB-Cameroun	AG	1 390 392 000	CAB /CSPM - CCCM (AG)	AOIO		15/02/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
24	Déploiement d'équipements solaires pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF - Phase2	AG	1 698 727 936	CAB /CSPM - CCCM (AG)	AOIO		10/01/2022	31/01/2022	14/02/2022	12/10/2022
25	Fourniture, formation et installation d'équipements solaires pour les différents Centres (TCP, CEAC/DAA et CPFF)*	AG	561 114 000	CAB /CSPM - CCCM (AG)	AOIO		26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/12/2021
26	Fourniture et installation d'équipements dans le cadre de la mise en œuvre d'une solution de banque électronique (e-banking) au profit de la CAMPOST	AG	1 800 263 000	CAB /CSPM - CCCM (AG)	AOIO		15/02/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
TOTAL			10 768 531 354							

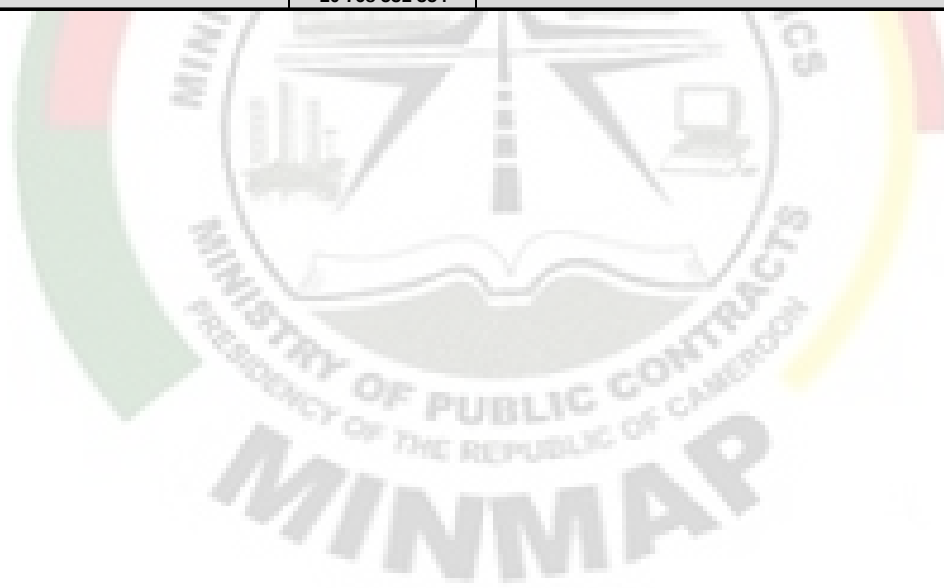

PROJET FILETS SOCIAUX (PFS)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement de la firme d'appui à la mise en oeuvre des interventions dans le cadre de l'étude quantitative sur les VBG (violence basée sur le genre)	SPI	80 000 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	QC			03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
2	Fourniture du matériel productif pour les sanctions positives (machettes et limes, machines à écraser avec bancs ,brouettes) au Projet Filets Sociaux	AG	241 200 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	16/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	07/06/2022
3	Recrutement d'une ONG chargée d'accompagner le projet Filets Sociaux dans la mise en oeuvre de la phase 9 des THIMO dans les régions de l'Adamaoua (commune de Meiganga), de l'Est (commune de Sangmélina et d'Ebolowa1)	SPI	115 549 000	FILETS SOCIAUX/CSPM6-CCCM (SPI)	QC			31/05/2021	14/06/2021	10/01/2022
4	Fourniture des consommables informatiques à l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux	AG	80 000 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	26/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	19/07/2021
5	Fourniture du matériel informatique, du matériel de téléphonie et des logiciels informatiques au Projet Filets Sociaux en 3 lots distincts	AG	264 000 000	FILETS SOCIAUX/CSPM6-CCCM (SPI)	AONO	06/04/2021	07/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	26/08/2021
6	Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe du projet Filets Sociaux, financement additionnel, exercice 2019-2020(18 mois), 2021	SPI	18 000 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR	26/03/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	27/06/2022
7	Entretien des motos du projet Filets Sociaux	SPI	20 000 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	DC	15/02/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	18/04/2022
8	Fourniture de 04 véhicules pick-up double cabine	AG	100 000 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	26/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	02/08/2021
TOTAL			918 749 000							

PROGRAMME AGROPOLES										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Electrification de l'usine de transformation de l'AGROPOLE de production d'ananas de N'lohe	AI	25 000 000	AGROPOLES/ CIPM	AONO	26/04/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	18/10/2021
2	Réhabilitation d'un ouvrage de franchissement sur la voie d'accès aux exploitations de l'AGROPOLE de production de maïs de Bertoua	ROUTES	12 000 000	AGROPOLES/ CIPM	AONO	26/04/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	18/10/2021
3	Construction d'un hall de vente de poisson frais pour l'AGROPOLES de poisson de la vallée du Ntem	BEC	9 000 000	AGROPOLES/ CIPM	AONO	26/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	16/09/2021
4	Réhabilitation de la voie d'accès aux exploitations de l'AGROPOLES de production de maïs de Ouro Dole	ROUTES	38 500 000	AGROPOLES/ CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
TOTAL			84 500 000							

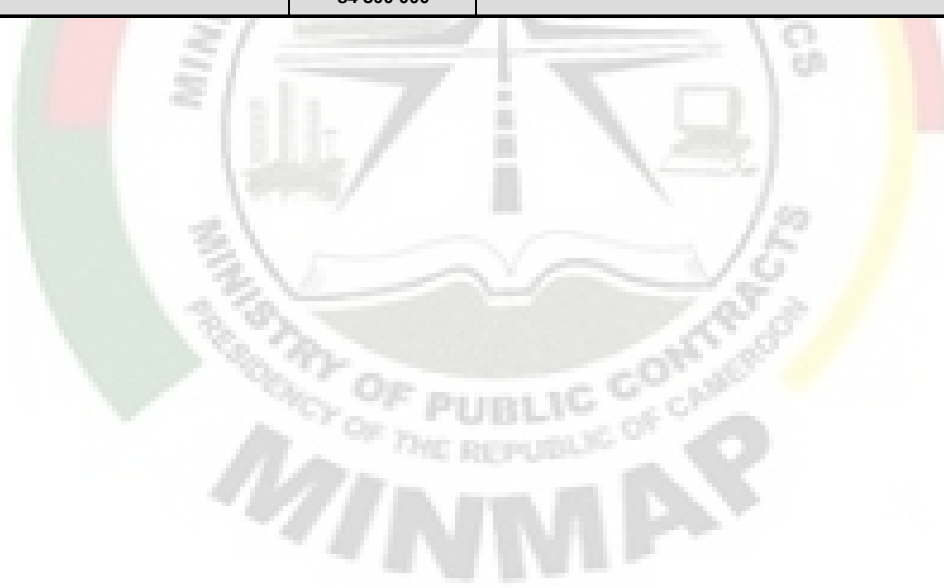

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-DJA)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Maîtrise d'œuvre : projet de mise en place de deux exploitations piscicoles dans les zones couvertes par le PADI-DJA	SPI	125 000 000	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	28/05/2021	03/09/2021	11/10/2021	25/10/2021	11/02/2022
2	Projet de valorisation du bambou de chine pour l'habillement et l'équipement des écolodges à B'I, Mintom	SPI	300 000 000	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	02/04/2021	01/06/2021	21/06/2021	05/07/2021	30/06/2022
3	Mise en place d'une unité de transformation de la biomasse en électricité et biofertilisant à Lomié	BEC	270 000 000	PADI-DJA/CSPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	12/09/2022
4	Maitrise d'œuvre de la Mise en place d'une unité de transformation de la biomasse en électricité et biofertilisant à Lomié	SPI	30 000 000	PADI-DJA/CSPM	AONR	29/03/2021	06/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	13/12/2022
5	Appui au développement des systèmes apicoles dans les communes bénéficiaires phase3	SPI	100 000 000	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	29/03/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	31/12/2021
6	Projet de mise en place de deux (02) exploitations piscicoles dans les zones couvertes par le PADI-Dja	BEC	1 125 000 000	PADI-DJA/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	29/03/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	28/12/2021
7	Projet de production agroécologique des cultures vivrières dans les sites d'exploitation cacaoyère	SPI	150 000 000	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	30/03/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	08/12/2021
8	Travaux de construction de 02 fermes semencières de cacaoyers de 03 ha chacune à Messamena et Meyomessi phase II et III	BEC	324 000 000	PADI-DJA/CSPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	13/06/2022
9	Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de 02 fermes semencières de cacaoyers de 03 ha chacune à Messamena et Meyomessi phase II et III	SPI	36 000 000	PADI-DJA/CSPM	AONR	29/03/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	18/07/2022
10	Projet de mise en place d'une porcherie moderne naisseur engraisseur a Djoum phase2	AG	400 000 000	PADI-DJA/CSPM	AONO	29/03/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	01/04/2022
11	Appui des populations riveraines à la collecte, la transformation et la commercialisation des PFNL dans la zone du PADI-DJA	SPI	300 000 000	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	30/03/2021	01/06/2021	21/06/2021	05/07/2021	27/12/2021

PROGRAMME D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (PCP -AFOP)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Evaluation à mi-parcours PCP-AFOP	SPI	35 000 000	PCP-AFOP/CSPM	AONR	11/01/2021	05/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	19/07/2021
TOTAL			35 000 000							



PROGRAMME DE CONSOLIDATION ET DE PERENISATION DU CONSEIL AGROPASTORAL (PCP-ACEFA)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'oeuvre de l' Electrification solaire des CTD du PCP-ACEFA (fourniture , installation et mise en service)	SPI	61 600 000	PCP-ACEFA/CIPM	AONR	15/03/2021	07/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	23/11/2021
2	Evaluation de la gestion administrative, comptable et Financière du CRPA de Garoua et la PLANOPAC	SPI	24 000 000	PCP-ACEFA/CIPM	AONR	14/09/2021	07/12/2021	10/01/2022	24/01/2022	25/03/2022
3	Electrification solaire des CTD du PCP-ACEFA (fourniture , installation et mise en service)	AI	554 400 000	PCP-ACEFA/CIPM	AONO	15/03/2021	04/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	23/11/2021
4	Acquisition de 1200 pneus avant et 1200 arrières avec chambres à air pour motos AG 100	AG	248 000 000	PCP-ACEFA/CIPM	AONO	08/03/2021	28/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/09/2021
5	Acquisition de 08 (huit)Véhicules Pick-Up double cabine pour les RCTE	AG	232 000 000	PCP-ACEFA/CIPM	AONO	23/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/08/2021
6	Evaluation à mi-parcours du PCP ACEFA	SPI	80 000 000	PCP-ACEFA/CIPM	AONR	19/04/2021	12/07/2021	16/08/2021	30/08/2021	29/10/2021
TOTAL			1 200 000 000							

PROGRAMME DE DECENTRALISATION FEICOM VILLES MOYENNES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction des boutiques au marché de Buéa	BEC	487 820 000	PDFVM/CSPM	AONO	15/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	22/02/2022
2	Travaux d'aménagement et de construction de parc à camions à Bafang	BEC	530 000 000	PDFVM/CSPM/CC CM(BEC)	AONO	25/01/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	08/02/2022
3	Travaux de construction des batiments au marché central de Bangangté Lot1: Construction de cinq (05) bâtiment	BEC	230 000 000	PDFVM/CSPM	AONO	10/12/2020	12/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	28/12/2021
4	Travaux de construction des batiments au marché central de Bangangté Lot 2 : Construction de (04) batiments et une rampe pour personnes à mobilité réduit	BEC	290 000 000	PDFVM/CSPM	AONO	10/12/2020	12/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	28/12/2021
5	Travaux de construction des bâtiments à l'aire de stationnement pour gros porteurs dans la ville de Kousséri	BEC	208 458 752	PDFVM/CSPM	AONO	15/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	22/02/2022
TOTAL			1 746 278 752							

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement des consultants en vue de la réalisation de l'étude des effets du Programme	SPI	17 500 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONR			01/03/2021	15/03/2021	15/03/2022
2	Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable en vue de l'audit des comptes et des états financiers du PEA-Jeunes pour les années 2021 et 2022 et final	SPI	7 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONR	10/03/2021	01/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	14/01/2022
3	Contractualisation par entente directe avec BRIDGE AFRICA en vue de la mise en place d'une plateforme dynamique de communication du PEA-Jeunes	SPI	15 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC			01/01/1900	15/01/1900	15/01/1901
4	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un manuel de gestion des performances sociales	SPI	10 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONR			01/03/2021	15/03/2021	15/03/2022
5	Recrutement d'un consultant en vue de l'étude pour l'amélioration de l'offre de crédit	SPI	10 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		01/03/2021	15/03/2021	15/03/2022
6	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration de la stratégie de sortie du mécanisme de refinancement alternatif	SPI	15 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		08/03/2021	22/03/2021	22/03/2022
7	Contractualisation sur la base d'une convention avec EPAB en vue du coaching de 253 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	82 225 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	15/04/2021		17/05/2021	31/05/2021	31/05/2022
8	Reconduction du contrat de l'expert Belinga Pierre en qualité de Responsable de la Gestion des Crédits (RGC) en appui à la mise en œuvre du mandat d'assistance technique de DID au Programme de Promotion de l'Entrepreneuriat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes)	SPI	8 796 381	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		08/03/2021	22/03/2021	22/03/2022
9	Contractualisation sur la base d'une convention avec IAO Obala en vue du coaching de 250 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	81 250 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	14/04/2021		17/05/2021	31/05/2021	31/05/2022
10	Contractualisation sur la base d'une convention avec CDSTS SANTA en vue du renforcement des capacités de 50 jeunes PIE dans la Région du Nord-Ouest	SPI	24 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	14/05/2021		14/06/2021	28/06/2021	24/12/2021
11	Reconduction du contrat de l'expert Maguiffo Sabine Flore en qualité de conseiller en financement agricole appui à la mise en œuvre du mandat d'assistance technique de DID au Programme de Promotion de l'Entrepreneuriat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes)	SPI	8 584 125	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		15/02/2021	01/03/2021	01/03/2022

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Contractualisation sur la base d'une convention avec NAZARETH CENTRE BAMENDA en vue du renforcement des capacités de 75 jeunes PIE dans la Région du Nord-Ouest	SPI	36 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/05/2021		21/06/2021	05/07/2021	31/12/2021
13	Contractualisation sur la base d'une convention avec CAIO MBEBE en vue du renforcement des capacités de 100 jeunes PIE dans la Région du Sud	SPI	48 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	13/05/2021		14/06/2021	28/06/2021	24/12/2021
14	Contractualiser sur la base d'une convention avec une struture d'incubation en vue de l'incubation numérique de 60 jeunes PIE	SPI	30 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		03/05/2021	17/05/2021	17/05/2022
15	Contractualisation sur la base d'une convention avec EFSC/ETA/CRA EBOLOWA en vue du renforcement des capacités de 125 jeunes PIE dans la Région du Sud	SPI	60 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	13/05/2021		14/06/2021	28/06/2021	24/12/2021
16	Contractualisation sur la base d'une convention avec IG POIVRE en vue du renforcement des capacités de 25 jeunes PIE dans la Région du Littoral	SPI	12 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	14/05/2021		14/06/2021	28/06/2021	24/12/2021
17	Contractualiser sur la base d'une convention avec CDSTS SANTA en vue du coaching de 150 jeunes PIE dans la Région du Nord-Ouest	SPI	48 750 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		03/05/2021	17/05/2021	17/05/2022
18	Contractualisation sur la base d'une convention avec CODAS EDEA en vue du renforcement des capacités de 50 jeunes PIE dans la Région du Littoral	SPI	24 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	13/05/2021		14/06/2021	28/06/2021	24/12/2021
19	Contractualisation sur la base d'une convention avec ETA DIBOMBARI en vue du renforcement des capacités de 100 jeunes PIE dans la Région du Littoral	SPI	48 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	12/05/2021		14/06/2021	28/06/2021	24/12/2021
20	Contractualiser sur la base d'une convention avec NAZARETH CENTRE BAMENDA en vue du coaching de 201 jeunes PIE dans la Région du Nord-Ouest	SPI	65 325 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		03/05/2021	17/05/2021	17/05/2022
21	Contractualisation sur la base d'une convention avec ISSAEER Sa'a en vue du renforcement des capacités de 100 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	48 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	11/05/2021		14/06/2021	28/06/2021	24/12/2021
22	Contractualiser sur la base d'une convention avec CAIO MBEBE en vue du coaching de 150 jeunes PIE dans la Région du Sud	SPI	48 750 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	05/12/1899		08/01/1900	22/01/1900	22/01/1901

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)


N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Contractualisation sur la base d'une convention avec KMC-IAO Obala en vue du renforcement des capacités de 75 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	36 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	10/05/2021		07/06/2021	21/06/2021	17/12/2021
24	Contractualisation sur la base d'une convention avec CFPEAAR Mfou en vue du renforcement des capacités de 100 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	48 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	10/05/2021		07/06/2021	21/06/2021	17/12/2021
25	Contractualiser sur la base d'une convention avec EFSC/ETA/CRA EBOLOWA en vue du coaching de 201 jeunes PIE dans la Région du Sud	AG	65 325 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		19/04/2021	03/05/2021	03/05/2022
26	Contractualisation sur la base d'une convention avec EPAB en vue du renforcement des capacités de 100 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	48 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	10/05/2021		07/06/2021	21/06/2021	17/12/2021
27	Contractualiser sur la base d'une convention avec IG POIVRE en vue du coaching de 75 jeunes PIE dans la Région du Littoral	SPI	24 375 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		19/04/2021	03/05/2021	03/05/2022
28	Contractualiser sur la base d'une convention avec CODAS EDEA en vue du coaching de 100 jeunes PIE dans la Région du Littoral	SPI	32 500 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		04/05/2020	18/05/2020	18/05/2021
29	Contractualiser sur la base d'une convention avec ETA DIBOMBARI en vue du coaching de 176 jeunes PIE dans la Région du Littoral	SPI	57 200 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	18/01/2021		27/04/2020	14/05/2020	14/05/2021
30	Contractualiser sur la base d'une convention avec ISSAEER Sa'a en vue du coaching de 70 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	22 750 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC			26/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
31	Contractualiser sur la base d'une convention avec KMC-IAO Obala en vue du renforcement des capacités de 60 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	19 500 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC			03/05/2021	17/05/2021	17/05/2022
32	Contractualisation sur la base d'une convention avec CFPEAAR Mfou en vue du coaching de 70 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	22 750 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI/QC	05/12/1899		08/01/1900	22/01/1900	22/01/1901
33	Contractualisation sur la base d'une convention avec IAO Obala en vue du renforcement des capacités de 125 jeunes PIE dans la Région du Centre	SPI	60 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	CI	12/02/2021		15/03/2021	29/03/2021	27/09/2021

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
34	Acquisition des fournitures de bureau pour la CNCG et les URAC	AG	16 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	DC	29/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
35	Conception et production des outils de sensibilisation et de communication	SPI	15 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONR			01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021
36	Réalisation de l'étude de caractérisation des bassins et des filières	SPI	30 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONR			01/03/2021	15/03/2021	15/03/2022
37	Aménagement du plateau technique du pôle maraîcher de Lablé (Bafia)	BEC	45 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	26/07/2021	15/10/2021	22/11/2021	06/12/2021	06/06/2022
38	Réhabilitation des infrastructures pédagogiques du pôle maraîcher de Lablé (Bafia)	BEC	30 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	26/07/2021	15/10/2021	22/11/2021	06/12/2021	06/06/2022
39	Mise à niveau du plateau technique de NAZARETH CENTRE de Bamenda	BEC	10 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	26/07/2021	15/10/2021	22/11/2021	06/12/2021	06/06/2022
40	Construire un bloc pédagogique et informatique à NAZARETH CENTRE Bamenda	BEC	10 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	23/07/2021	11/10/2021	15/11/2021	29/11/2021	30/05/2022
41	Construire un bloc pédagogique et informatique, un dortoir et un refectoire à ETA/CRA Ebolowa	BEC	35 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	20/07/2021	08/10/2021	15/11/2021	29/11/2021	30/05/2022
42	Mise à niveau du plateau technique de ETA Dibombari	BEC	13 500 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	19/07/2021	08/10/2021	15/11/2021	29/11/2021	30/05/2022
43	Construire un bloc pédagogique et informatique à ETA Dibombari	BEC	20 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	19/07/2021	08/10/2021	15/11/2021	29/11/2021	30/05/2022
44	Construire une infrastructure de production animale à EPAB Binguela	BEC	108 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	13/07/2021	01/10/2021	08/11/2021	22/11/2021	23/05/2022

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
45	Construire un dortoir et un bloc pédagogique et informatique à EPAB Binguela	BEC	53 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	13/07/2021	01/10/2021	08/11/2021	22/11/2021	23/05/2022
46	Construire des infrastructures complémentaires à l'IAO Obala	BEC	15 502 500	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	12/07/2021	01/10/2021	08/11/2021	22/11/2021	23/05/2022
47	Construction d'une infrastructure de production végétale à l'IAO Obala	BEC	9 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	12/07/2021	01/10/2021	08/11/2021	22/11/2021	23/05/2022
48	Construction d'une infrastructure de production animale à l'IAO Obala	BEC	103 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	05/07/2021	24/09/2021	01/11/2021	15/11/2021	16/05/2022
49	Construction d'une salle de cours, un dortoir et un refectoire à l'IAO Obala	BEC	106 500 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	05/07/2021	24/09/2021	01/11/2021	15/11/2021	16/05/2022
50	Acquisition des consommables informatiques pour la CNCG Et les URAC	AG	16 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	DC	05/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	05/07/2021
51	Acquisition du matériel informatique destiné au RGAE	AG	178 950 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	15/03/2021	04/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	24/09/2021
52	Acquisition d'un véhicule PICKUP 4X4 double cabine pour le renforcement des capacités du Réseaux National des Jeunes	AG	23 500 000	PEA-JEUNES/CSPM	DC	24/05/2021	18/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	21/09/2021
53	Acquisition d'un lot d'équipements et programme informatique pour la gestion de la performance sociale des IFR	AG	100 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	31/05/2021	20/08/2021	27/09/2021	11/10/2021	10/12/2021
54	Acquisition de 24 lots d'équipements informatique des IFR	AG	24 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	DC	17/05/2021	11/06/2021	02/07/2021	16/07/2021	14/09/2021
55	Acquisition de 40 ordinateurs portables, 200 ordinateurs fixes, 15 imprimantes multifonction, 40 onduleurs, 40 kits de stockage des données pour le renforcement des capacités des Structures d'incubation	AG	164 000 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	18/01/2021	09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
56	Edition des outils de sensibilisation et de communication	SPI	53 900 000	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	29/03/2021	18/06/2021	26/07/2021	09/08/2021	08/10/2021
TOTAL			2 364 433 006							

PROGRAMME DE TRANSFORMATION ET VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES Volet CENTRE DE FORMATION AUX METIERS (TRANSFAGRI CFM)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Branchement du CFM de Ngaoundéré au réseau CAMWATER	AI	17 000 000	MINEFOP/CIPM	DC	12/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	10/08/2021
2	Acquisition des équipements et matériels didactiques au CFM de NDOP	AG	425 000 000	MINEFOP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	07/05/2021	06/08/2021	13/09/2021	27/09/2021	24/01/2022
3	Electrification des CFM de Bertoua : Lot 1	AI	36 500 000	MINEFOP/CIPM	AONO	14/05/2021	02/08/2021	06/09/2021	20/09/2021	20/12/2021
4	Electrification des CFM de Ngaoundéré : Lot 2		60 100 000							
5	Construction des CFM de Ngaoundéré : Lot 2	BEC	1 000 000 000	MINEFOP/CIPM-CCCM(BEC)	AOIO	08/03/2021	05/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	15/11/2022
6	Construction des CFM de Bertoua : Lot 1		800 000 000							
TOTAL			2 338 600 000							

PROGRAMME DE TRANSFORMATION ET VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES volet STRATEGIE NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE (TRANSFAGRI-SNFI)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une assistance technique en vue de la mise en œuvre du projet TRANSFAGRI	SPI	617 000 000	MINFI/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	29/03/2021	02/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	23/08/2022
2	Recrutement d'une assistance technique Internationale en gestion de la performance sociale, protection de la clientèle et de la gouvernance au sein des établissements de microfinance	SPI	135 000 000	MINFI/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	29/03/2021	02/08/2021	06/09/2021	20/09/2021	20/09/2022
TOTAL			752 000 000							

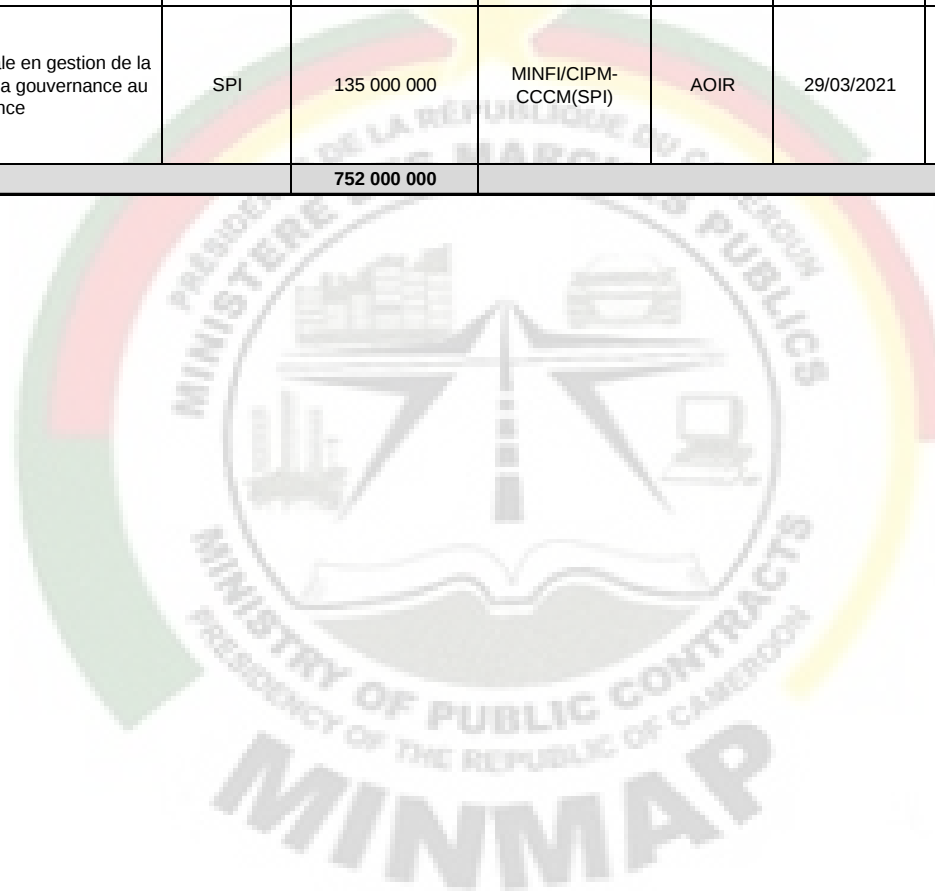

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Produire 20 000 block de Voucher des screening (50 vouchers)	SPI	11 925 593	MINSANTE/CIPM	DC	28/12/2020	22/01/2021	12/02/2021	26/02/2021	29/03/2021
2	Reproduire et diffuser 80.000 autocollants (pour les transporteurs publics) sur la TB par an (100 F CFA).	SPI	9 539 999	MINSANTE/CIPM	DC	02/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	03/05/2021
3	Acquisition des fournitures/ Supports de communication pour la commémoration de la journée Mondiale de Lutte contre la communication (JMLP	AG	19 020 672	MINSANTE/CIPM	DC	02/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	03/05/2021
4	LOT N°1: Doter les 400 ASC en matériels (valises, cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-shirts ,badges etc.) pour l'exécution de leurs tâches.	AG	14 309 998	MINSANTE/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/04/2021
5	LOT N°2: Doter les 600 APS en matériels (valises, cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-shirts, badges etc.	AG	19 352 980	MINSANTE/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/04/2021
6	Doter les 160 mentors en matériels (valises, cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-shirts, badges etc.)	AG	5 723 998	MINSANTE/CIPM	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/04/2021
7	Purchase specimen transportation flask and ice bags for transportation of specimens for ICF regions.	AG	16 689 038	MINSANTE/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/04/2021
8	Reproduire des boites à image pour les CDT 3) et les OBC pour cible PVVIH et malades TB et prisonniers,	SPI	7 104 913	MINSANTE/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/04/2021
9	LOT N°1: Achat consommables informatiques GTC: encre, Par trimestre chaque année	AG	7 154 999	MINSANTE/CIPM	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/04/2021
10	LOT N°2: Achat de 02 Copieurs multifonctions Canon IR 2525 (tout en un) : bâtiment administratif et service financier		11 567 246			25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/04/2021
11	Produire 6000 Registres de screening de la TB pour les 6000 FOSA)	SPI	75 842 992	MINSANTE/CIPM	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/04/2021

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	LOT N°1: Acquérir les téléphones et un abonnement pour la flotte téléphonique des 261 anciens CDT (2 pers/CDT), 11 anciens centres TBMR ,	AG	112 043 720	MINSANTE/CIPM/C CCM-SPI	AONO	29/01/2021	01/04/2021	03/05/2021	13/05/2021	05/06/2024
13	LOT N°2 : Acquérir les téléphones et un abonnement pour la flotte téléphonique des 125 nouveau CDT (2 pers), 261 personnel labo 4 centres TBMR , 10 field Coordinators, 1 point focal GTC ICF10 000FCFA/mois et par personne (		47 524 856	MINSANTE/CIPM		29/01/2021	01/04/2021	03/05/2021	13/05/2021	15/05/2024
14	Souscrire une police d'assurance maladie pour le personnel du bénéficiaire principal	SPI	400 140 074	MINSANTE/CIPM/C CCCM- (SPI)	AONO	08/02/2021	29/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	2705/2024
15	Assurances annuelle (Tout risques) pour 12 véhicules régions (voitures neuves) chaque année	SPI	15 025 503	MINSANTE/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	28/03/2022
16	Transport de crachats du niveau régional vers le niveau central – chaque année, pendant les 3 années	SPI	53 662 496	MINSANTE/CIPM	AONR	14/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	06/03/2024
17	Fournitures d'une connexion Internet par fibre optique au GTC au GTC. 10 Mbps fibre optique LS (liaison spécialisé) par mois.	SPI	64 264 609	MINSANTE/CIPM	AONR	29/01/2021	05/04/2021	10/05/2021	20/05/2021	06/05/2021
TOTAL			890 893 686							

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Achat des équipements non sanitaires	AG	329 505 152	PNLP/CSPM-CCCM (AG)	AONO	08/02/2021	23/04/2021	24/05/2021	03/06/2021	02/08/2021
2	Achats des véhicules	AG	200 914 352	PNLP/ CSPM	AONO	25/02/2021	26/04/2021	28/05/2021	07/06/2021	06/08/2021
3	Achat consommable pour lutte anti covid19	AG	203 693 232	PNLP/ CSPM	AONO	18/02/2021	19/04/2021	21/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
4	Production de documents d'imprimerie	SPI	539 429 800	PNLP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	29/03/2021	17/06/2021	19/07/2021	29/07/2021	27/09/2021
5	Acquisition des fournitures/supports de communication pour la commémoration de la journée Mondiale de Lutte contre la Communication (JMLP)	AG	15 950 250	PNLP/ CSPM	AONO	02/04/2021	21/06/2021	26/07/2021	09/08/2021	08/10/2021
6	Acquisition des MILDA	AG	22 999 820	PNLP/ CSPM	AONO	29/03/2021	31/05/2021	02/07/2021	12/07/2021	10/09/2021
7	Acquisition des TDRs	AG	402 920 288	PNLP/ CSPM-CCCM (AG)	GG	08/02/2021		22/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
8	Acquisition des MILDA	AG	1 927 524 397	PNLP/ CSPM	GG	08/02/2021		22/03/2021	02/04/2021	01/07/2021
9	Fourniture d'une flotte téléphonique pour le personnel administratif, technique et financier	AG	33 000 000	PNLP/ CSPM	AONO	08/02/2021	12/04/2021	14/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
10	Acquisition des intrants antipaludiques	AG	1 889 546 454	PNLP/ CSPM-CCCM (AG)	GG	21/01/2021		01/03/2021	12/03/2021	11/05/2021
11	Mise en service d'une bande passante pour connexion internet et fourniture des flybox	AI	30 600 000	PNLP/ CSPM	AONO	04/03/2021	03/05/2021	04/06/2021	14/06/2021	29/07/2021
12	Production des spots TV et Radio	AG	38 737 292	PNLP/ CSPM	AONO	04/03/2021	03/05/2021	04/06/2021	14/06/2021	13/09/2021
13	Location des magasins de stockage des MILDA	SPI	78 894 400	PNLP/ CSPM	AONR	08/02/2021	19/04/2021	21/05/2021	31/05/2021	31/05/2022
14	Assurance maladie du personnel du PR	SPI	114 792 472	PNLP/ CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	25/01/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	19/07/2022
15	Assurance annuel tout risques des véhicules(neufs)	SPI	12 800 000	PNLP/ CSPM	AOIR	08/01/2021	19/04/2021	21/05/2021	31/05/2021	31/05/2022
16	Assistance technique	SPI	190 467 552	PNLP/ CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	05/02/2021	27/05/2021	28/06/2021	08/07/2021	06/10/2021
TOTAL			6 031 775 461							

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDE ET SES ENVIRONS A PARTIR DU FLEUVE SANAGA (PAEPYS)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Avenant No1 au Marché N°00360/M/MINMAP/SG/DGMI/DMAI /CKW/2017 du 17 novembre 2017 passe suivant autorisation de gré à gré N°003520/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI /CE5 du 16 MAI 2017 renouvelée par lettre N°05833/L/MINMAP/DGMI/DMAI /CKW du 16 août 2017 pour l'assistance géotechnique a la maitrise d'ouvrage dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable de ville de Yaoundé et ses environs	SPI	750 000 000	PAEPYS/CSPM-CCCM(SPI)	AVENANT			08/02/2021	22/02/2021	26/09/2022
2	Manuel de procédures	SPI	15 000 000	PAEPYS/CSPM	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
3	Souscription biennale d'une police d'assurance en vue de la couverture Maladie du personnel et familles du Projet d'Alimentation en Eau Potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga.	SPI	15 917 372	PAEPYS/CSPM	AONR	29/03/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	20/06/2022
4	Souscription annuelle d'une police d'assurance flotte automobile pour la couverture des véhicules du parc automobile du projet d'alimentation en eau potable de ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga.	SPI	25 000 000	PAEPYS/CSPM	DC	15/03/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	16/05/2022
5	SINOMACH (marché de base+avenants)	AI	73 500 000 000	PAEPYS/CSPM - CCCM (AI)	GG	En cours d'exécution				20/12/2024
6	Maitrise d'œuvre SEURECA VEOLIA (marché de base +avenants).	SPI	3 194 384 896	PAEPYS/CSPM - CCCM (SPI)	AONR	En cours d'exécution				05/04/2022
7	Entretien et nettoyage des bureaux du siège de l'unité opérationnelle du PAEPYS.	SPI	16 000 000	PAEPYS/CSPM	DC	16/04/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/06/2022
8	Gardiennage et sécurisation du siège de l'unité opérationnelle du PAEPYS.	SPI	15 000 000	PAEPYS/CSPM	DC	16/04/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/06/2022
TOTAL			77 531 302 268							

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un(e) assistant(e) de direction à l'unité de gestion du PATNUC pour la mise en vigueur du « program for the accélération of the digital transformation of Cameroon	SPI	6 090 000	PNDP/CSPM	CI			24/02/2021	11/03/2021	13/03/2023
2	Recrutement d'un project associate	SPI	33 060 000	PNDP/CSPM	CI			17/02/2021	04/03/2021	06/03/2023
3	Renforcement des capacités des personnels du ministère des postes et télécommunications (MINPOSTEL), de l'agence de régulation des télécommunications (art) de l'agence nationale des technologies de l'information et de la communication (ANTIC), de l'école nationale supérieure des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (SUP'PTIC) et du CNNCA	SPI	58 000 000	PNDP/CSPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
4	Recrutement du chef de projet	SPI	36 540 000	PNDP/CSPM	CI			24/02/2021	10/03/2021	13/03/2023
5	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit des comptes financier et comptable du projet de réforme du secteur des TIC	SPI	17 400 000	PNDP/CSPM	AONR	08/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
6	Sélection d'un consultant pour l'audit des cadres règlementaires de l'ensemble des secteurs clés impactés par le développement de l'économie numérique et proposition de recadrage	SPI	203 000 000	PNDP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	16/03/2021	18/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	19/10/2021
7	Sélection d'un consultant pour la mise en place d'une plateforme de mesure de la qualité d'expérience et de comparaison des tarifs des services de communications électroniques (voix, sms, internet)	SPI	58 000 000	PNDP/CSPM	AONR	15/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
8	Sélection d'un consultant pour une étude en vue du renforcement des filières prioritaires ayant un fort potentiel de croissance, par l'intégration des TIC	SPI	150 800 000	PNDP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	15/02/2021	20/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
9	Sélection d'un consultant en appui pour l'élaboration d'un manuel d'exécution du projet de réforme du secteur des TIC	SPI	10 440 000	PNDP/CSPM	CI			26/04/2021	10/05/2021	09/06/2021
10	Sélection d'un consultant en appui pour l'élaboration d'un manuel de procédures, de gestion administratives, financière, comptable et de passation des marches du projet de réforme du secteur des tic (PRSTIC)	SPI	10 440 000	PNDP/CSPM	CI			26/04/2021	10/05/2021	09/06/2021
11	Sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude en vue de la détermination des marches pertinents et de la désignation des opérateurs dominants du secteur des télécommunications au Cameroun	SPI	220 400 000	PNDP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	09/03/2021	11/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Sélection d'un consultant en appui à la mise en place des mécanismes pérennes de suivi et de contrôle de l'exécution des cahiers des charges des operateurs	SPI	109 040 000	PNDP/CSPM-CCCM (SPI)	CI			22/02/2021	08/03/2021	07/06/2021
13	Sélection d'un consultant pour la proposition d'un cadre normatif pour une dématérialisation harmonisée des procédures administratives	SPI	82 360 000	PNDP/CSPM	AONR	15/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	04/06/2021
14	Acquisition des fournitures de bureau complémentaires pour l'unité de gestion du PATNUC	AG	28 420 000	PNDP/CSPM	DC	08/03/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	24/05/2021
15	Acquisition et installation du matériel informatique complémentaire pour l'unité de gestion du PATNUC	AG	46 400 000	PNDP/CSPM	DC	01/01/2021	25/01/2021	15/02/2021	01/03/2021	15/04/2021
16	Fourniture et acquisition des mobiliers de bureau complémentaires pour l'unité de gestion du projet de réforme du secteur des TIC	AG	11 600 000	PNDP/CSPM	DC	22/03/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	07/06/2021
17	Fourniture, pause et acquisition des stores plus sécurisation renforcée des locaux du PRSTIC	AG	20 300 000	PNDP/CSPM	DC	09/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	10/05/2021
18	Acquisition des équipements dans le cadre de la segmentation des marches de communications électroniques dans un environnement convergent et appui à la mise à jour des outils de régulation des marches	AG	29 000 000	PNDP/CSPM	DC	01/01/2021	25/01/2021	15/02/2021	01/03/2021	30/04/2021
19	Acquisition des équipements dans le cadre de l'appui à la mise en place des mécanismes pérennes de suivi et de contrôle de l'exécution des cahiers des charges des operateurs	AG	23 200 000	PNDP/CSPM	DC	03/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	31/08/2021
20	Petits travaux de réfections complémentaires de (05) bureaux, réaménagement d'une (01) grande salle de conférence, d'une (01) petite salle de conférence, de deux (02) salles d'eau, d'une (01) kitchenette offerts par le MINPOSTEL pour loger le PRSTIC dans ses phases du PPA et de mise en œuvre	BEC	29 000 000	PNDP/CSPM	DC	08/03/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	21/06/2021
TOTAL			1 183 490 000							

PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements informatiques pour l'Unité de Gestion du Projet (UGP) Prolac à Kousserie	AG	58 000 000	PEPS/CSPM	AONR	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport et la mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la performance des unités de gestion des projets, y compris leur personnel	SPI	10 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			10/02/2021	25/02/2021	25/06/2021
3	Recrutement d'une firme internationale pour une Assistance technique dans les domaines de la gestion intégrée des investissements publics	SPI	870 000 000	PEPS/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	11/01/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/07/2024
4	Recrutement d'une firme internationale pour une Assistance technique dans les domaines de la consolidation budgétaire	SPI	870 000 000	PEPS/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	28/12/2020	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/06/2024
5	Recrutement de l'auditeur externe des comptes du projet PEPS	SPI	20 000 000	PEPS/CSPM	AONR	28/12/2020	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	28/07/2022
6	Recrutement d'un cabinet pour effectuer le diagnostic du processus de production et de remontée des données sur la performance au MINEDUB et au MINSANTE	SPI	40 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			27/01/2021	11/02/2021	11/06/2021
7	Recrutement d'un cabinet d'études en vue de la rédaction d'un cahier des charges et du développement d'une application intégrant des modules de suivi de l'exécution et la géolocalisation des projets d'investissements publics, y compris le processus de suivi citoyen	SPI	120 000 000	PEPS/CSPM-CCCM (SPI)	CI/QC			09/03/2021	25/03/2021	23/07/2021
8	Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système d'information de stockage et de partage des données de conjoncture économique pour l'élaboration du cadrage macroéconomique	SPI	30 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			24/03/2021	08/04/2021	06/08/2021
9	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'interconnexion entre l'immeuble siège de l'INS et trois agences régionales	SPI	20 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			10/06/2021	24/06/2021	22/09/2021
10	Recrutement d'un cabinet d'études chargé de l'élaboration des devis estimatifs par type de logement	SPI	40 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			17/03/2021	01/04/2021	30/06/2021
11	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du recueil de document des outils de facilitation des procédures de passation, d'exécution et du contrôle des marchés publics	SPI	20 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			11/03/2021	25/03/2021	23/07/2021

PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Recrutement d'un cabinet en vue de l'assistance technique, la conception et l'implémentation du e-tracking	SPI	76 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			26/05/2021	10/06/2021	06/12/2021
13	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie de formation dans le secteur des marchés publics	SPI	20 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			15/01/2021	29/01/2021	29/04/2021
14	Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'étude (Document de stratégie d'amélioration de l'absorption des financements extérieurs au Cameroun et élaboration des cadres de coopération ainsi que le guide méthodologique sur la gestion du cycle de vie des projets	SPI	60 000 000	PEPS/CSPM	AONR			10/03/2021	25/03/2021	23/07/2021
15	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la performance des unités de gestion des projets, y compris leur personnel	SPI	20 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			02/03/2021	18/03/2021	16/07/2021
16	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport et la mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la performance des unités de gestion des projets, y compris leur personnel	SPI	10 000 000	PEPS/CSPM	AONR			10/03/2021	25/03/2021	23/07/2021
17	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la politique d'aide au développement	SPI	20 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			03/03/2021	18/03/2021	17/05/2021
18	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place des IRR au niveau des entreprises publiques en vue de la production des données financières fiables	SPI	70 000 000	PEPS/CSPM	CI/QC			26/02/2021	12/03/2021	12/07/2021
19	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie sur les entreprises et les établissements publics	SPI	19 699 700	PEPS/CSPM	CI/QC			09/02/2021	25/02/2021	26/05/2021
20	Recrutement d'un consultant individuel pour la dissémination du nouveau corpus juridique sur les entreprises et les établissements publics	SPI	15 950 000	PEPS/CSPM	CI/QC			29/01/2021	12/02/2021	14/06/2021
21	Traduction, impression et dissémination du rapport sur les cadres de coopération et de cycle de vie des projets	SPI	12 000 000	PEPS/CSPM	DC	24/05/2021	18/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	13/08/2021
22	Traduction et impression et dissémination du rapport auprès des structures en charge de la mobilisation des fonds et des projets de la Banque Mondiale	SPI	10 000 000	PEPS/CSPM	DC	26/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	16/07/2021

PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Traduction et impression du Manuel de procédures de suivi et des référentiels	SPI	7 000 000	PEPS/CSPM	DC	28/06/2021	23/07/2021	13/08/2021	27/08/2021	17/09/2021
24	Fourniture et Installation de 3 dispositifs de visioconférence (président COS, salles de réunion Chef de composante 2) pour le plan Covid-19 y compris les licences pour lesdits dispositifs	AG	84 000 000	PEPS/CSPM	AONO	01/03/2021	21/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/08/2021
25	Impression du Guide sur les techniques de budgétisation des projets FINEX	SPI	10 000 000	PEPS/CSPM	DC	26/07/2021	20/08/2021	10/09/2021	24/09/2021	08/10/2021
26	Souscription a une police d'assurance tous risque pour le matériel roulant	SPI	10 000 000	PEPS/CSPM	AONR	07/06/2021	30/08/2021	04/10/2021	18/10/2021	18/10/2022
27	Sécurité GPS pour matériel roulant	SPI	10 000 000	PEPS/CSPM	AONR	07/06/2021	30/08/2021	04/10/2021	18/10/2021	18/10/2022
28	Acquisition du matériel roulant pour le compte du projet PEPS en trois lots distincts: Lot1 (15 motos)	AG	62 500 000	PEPS/CSPM	AONO	15/02/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	19/08/2021
29	Acquisition du matériel roulant pour le compte du projet PEPS en trois lots distincts: Lot2 (06 Pick up 4*4 double cabine)		180 000 000							
30	Acquisition du matériel roulant pour le compte du projet PEPS en trois lots distincts: Lot 3 (03 4*4 Grand format, dont 01 SUV et 01 MINI BUS de 15 places)		201 000 000							
31	Gardiennage des locaux	SPI	11 000 000	PEPS/CSPM	AONR	08/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	21/06/2022
32	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de l'UTAC	SPI	20 000 000	PEPS/CSPM	AONR	08/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	21/06/2022
33	Acquisition du logiciel EvIEWS	AG	15 000 000	PEPS/CSPM	AONO	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	19/07/2021
34	Acquisition et installation d'un système de visioconférence et sonorisation dans l'immeuble siège de l'INS	AG	128 000 000	PEPS/CSPM	AONO	16/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
35	Equipements à acquérir dans le cadre de l'enquête panel sur la COVID 19 et l'enquête ECAM 5	AG	96 280 000	PEPS/CSPM	AONO	09/02/2021	30/04/2021	07/06/2021	21/06/2021	12/07/2021


PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
36	Traduction et impression des monographies de l'ECAM 4, phase 2	SPI	23 000 000	PEPS/CSPM	DC	01/03/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	21/05/2021
37	Impression du recueil des documents types de passation des marchés publics : (DAO types, Demande de Cotation et dossiers de consultation)	SPI	18 000 000	PEPS/CSPM	DC	31/05/2021	25/06/2021	16/07/2021	30/07/2021	30/08/2021
38	Traduction et impression des guides pour diffusion (guides d'indemnisation)	SPI	8 000 000	PEPS/CSPM	DC	01/03/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	14/05/2021
39	Impression et dissémination du rapport auprès des structures en charge de la mobilisation des fonds et des projets de la Banque Mondiale	SPI	6 400 000	PEPS/CSPM	DC	24/05/2021	18/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	06/08/2021
40	Traduction, édition et multiplication d'un recueil de textes et d'outils de la nouvelle démarche de maturation des projets d'investissement public en Français et en anglais	SPI	6 000 000	PEPS/CSPM	DC	28/12/2020	22/01/2021	12/02/2021	26/02/2021	19/03/2021
41	Aménagement des locaux du projet PROLAC	SPI	13 400 000	PEPS /CSPM	AONR	09/08/2021	01/11/2021	06/12/2021	20/12/2021	03/02/2022
42	Achat et installation de 15 climatiseurs pour les locaux du prolac à Kousséri	AG	17 400 000	PEPS /CSPM	AONO	07/06/2021	27/08/2021	04/10/2021	18/10/2021	02/12/2021
43	Achat d'un groupe électrogène pour les locaux du projet PROLAC	AG	23 200 000	PEPS /CSPM	AONR	07/06/2021	30/08/2021	04/10/2021	18/10/2021	02/12/2021
44	Acquisition des mobiliers de bureau	AG	43 500 000	PEPS /CSPM	AONR	08/06/2021	31/08/2021	04/10/2021	18/10/2021	02/12/2021
45	Acquisition et paramétrage du logiciel TOM2PRO pour le PROLAC	AG	11 600 000	PEPS /CSPM	GG			01/02/2021	15/02/2021	01/04/2021

PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
46	Acquisition de 02 pick-up pour le compte du PROLAC	AG	56 800 000	PEPS /CSPM	AONO	14/06/2021	03/09/2021	11/10/2021	25/10/2021	24/12/2021
47	Acquisition des équipements informatiques pour l'UGP PROLAC Kousséri	AG	58 000 000	PEPS /CSPM	AONR	12/07/2021	04/10/2021	08/11/2021	22/11/2021	06/01/2022
48	sélection d'un consultant pour l'élaboration du site Web dynamique et interactif du PROLAC	SPI	16 200 000	PEPS /CSPM	CI/QC			12/04/2021	26/04/2021	12/07/2021
49	Recrutement d'un consultant individuel pour le paramétrage de TOMPRO disponible au PEPS en vue de la comptabilité du PROLAC en phase de PPA	SPI	5 800 000	PEPS /CSPM	CI/QC			15/02/2021	01/03/2021	15/04/2021
50	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme de financement basé sur la performance relatives aux activités nécessitant la mise en place d'une convention de collaboration avec les services déconcentrés du MINADER et du MINEPIA dans le cadre du PROLAC	SPI	29 000 000	PEPS /CSPM	CI/QC			15/03/2021	29/03/2021	14/06/2021
51	Elaboration de la stratégie d'engagement citoyen du PROLAC	SPI	35 000 000	PEPS /CSPM	CI/QC			15/03/2021	29/03/2021	07/07/2021
52	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des PAR pour les infrastructures routières du PROLAC	SPI	35 000 000	PEPS /CSPM	CI/QC			15/02/2021	01/03/2021	31/05/2021
53	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des EIES pour la construction des infrastructures de mobilité rurale pour le compte du PROLAC	SPI	52 200 000	PEPS /CSPM	CI/QC			31/05/2021	14/06/2021	22/09/2021
54	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur la mécanisation dans la zone du Projet	SPI	29 000 000	PEPS /CSPM	CI/QC			05/04/2021	19/04/2021	28/07/2021
55	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un guide sur les modalités de mise à disposition des intrants agricoles dans le cadre du PROLAC	SPI	11 600 000	PEPS /CSPM	CI/QC			15/02/2021	01/03/2021	17/05/2021
56	Réalisation des études de faisabilité des cinq activités à mettre en œuvre au PROLAC suivant l'approche HIMO	SPI	52 200 000	PEPS /CSPM	CI/QC			05/04/2021	19/04/2021	02/08/2021
TOTAL			3 817 729 700							

PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE 07 CENTRES PILOTES (AEP 07 CENTRES)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes du projet, Exercices 2020-2021	SPI	15 000 000	AEP 07 CENTRE/CSPM	AONR	15/03/2021	07/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	24/09/2021
TOTAL			15 000 000							



PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION ET DU CLIMAT DES AFFAIRES (PAMOCA)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des Equipements Informatiques spécifiques au système Cadastrale: Lot 1	AG	432 272 576	PAMOCA/CSPM-CCCM (AG)	AOIO	21/06/2021	18/10/2021	22/11/2021	06/12/2021	07/03/2022
2	Acquisition des Equipements Informatiques spécifiques au système Cadastrale: Lot 2		503 999 712	PAMOCA/CSPM-CCCM (AG)		21/06/2021	18/10/2021	22/11/2021	06/12/2021	07/03/2022
TOTAL			936 272 288							

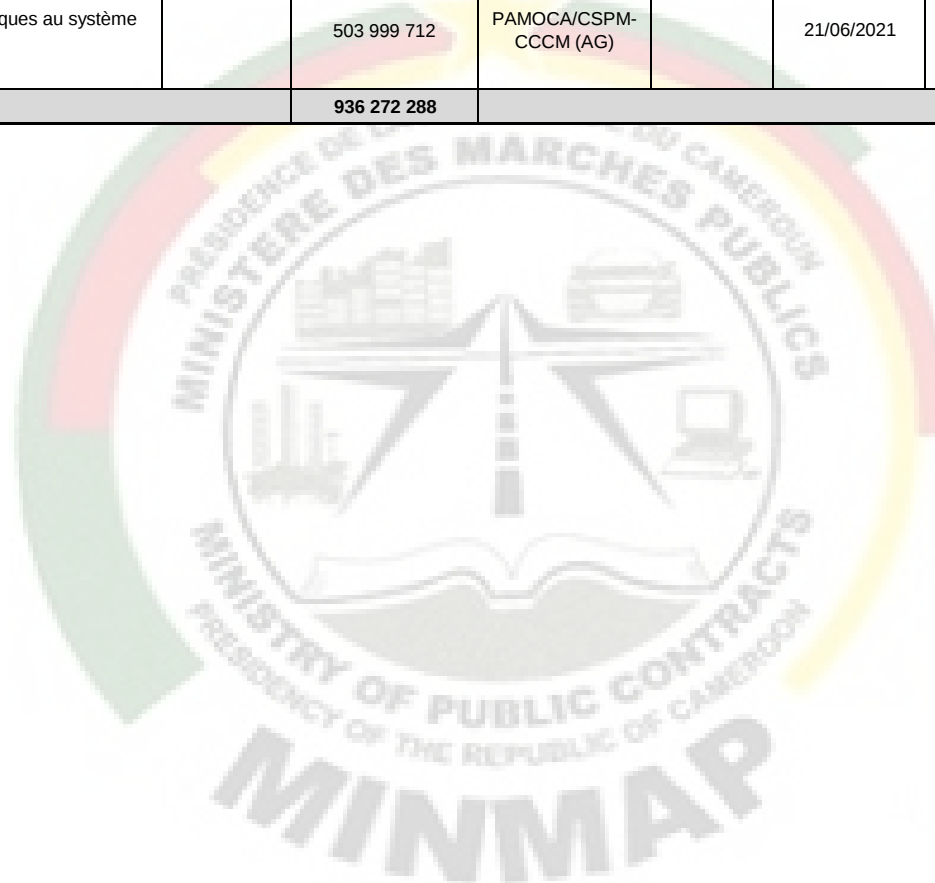

PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Gardiennage des locaux du PAREC	SPI	7 500 000	PAREC /CSPM	CI/QC			15/01/2021	26/01/2021	26/01/2022
2	Consommables informatiques de UCG	AG	50 000 000	PAREC /CSPM	AONO	08/03/2021	28/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	19/07/2022
3	Acquisition du matériel pour la collecte de données GEMS (smartphones, kits internet, cartes multimédias, Disques durs, etc.)	AG	21 000 000	PAREC /CSPM	DC	26/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
4	Audit externe des comptes 2019 - 2020	SPI	15 000 000	PAREC /CSPM	CI/QC			29/01/2021	12/02/2021	15/03/2021
5	Vérification externe de l'atteinte des DLIs de l'année 2020	SPI	85 000 000	PAREC /CSPM	CI/QC			05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
6	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de réponse et plan opérationnel 2021-2026 de l'afflux des déplacés internes (fin janvier 2021)	SPI	20 000 000	PAREC /CSPM	CI/QC			15/04/2021	29/04/2021	14/06/2021
7	Elaboration d'un manuel de procédures de gestion des fonds	SPI	15 000 000	PAREC /CSPM	CI/QC			13/04/2021	29/04/2021	31/05/2021
8	Conception et implémentation d'un module de collecte et saisie pour utilisation sur terminal mobile (tablettes...)	SPI	11 550 000	PAREC /CSPM	CI/QC			26/03/2021	09/04/2021	10/05/2021
9	Equipement/Outils des Cellules statistiques MINEFOP MINESUP et de la plateforme à l'INS en matériels informatiques	AG	635 387 520	PAREC /CSPM-CCCM (AG)	AONO	29/01/2021	30/04/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
10	Réhabilitation des salles informatiques des cellules statistiques du MINEDUB et du MINESEC	BEC	66 000 000	PAREC /CSPM	AONO	20/01/2021	09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/06/2021

PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Récrutement d'un Consultant international - Schéma directeur informatique	SPI	17 325 000	PAREC /CSPM	CI/QC			26/02/2021	12/03/2021	12/04/2021
12	Acquisition du Matériel de Travail pour l'UAS	AG	50 000 000	PAREC /CSPM	AONO	10/02/2021	30/04/2021	07/06/2021	21/06/2021	21/07/2021
13	Acquisition des fournitures de bureau pour l'UAS	AG	10 000 000	PAREC /CSPM	DC	24/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	10/05/2021
14	Recrutement d'un consultant pour la Formation sur Les évaluations internationales	SPI	19 692 792	PAREC /CSPM	CI/QC			10/03/2021	25/03/2021	26/04/2021
15	Recrutement d'un consultant pour la révision de la politique nationale du préscolaire et la stratégie de mise en oeuvre des CPC.	SPI	25 000 000	PAREC /CSPM	CI/QC			25/03/2021	08/04/2021	10/05/2021
16	Reprographie des manuels et cahiers de formation du niveau 2	SPI	100 000 000	PAREC /CSPM-CCCM (SPI)	AONO	15/01/2021	16/04/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/08/2021
17	Recrutement de l'évaluateur externe de 2ème année.	SPI	85 000 000	PAREC /CSPM	CI/QC			05/02/2021	19/02/2021	05/04/2021
18	Recrutement d'un prestataire pour l'acquisition et la distribution des manuels essentiels	SPI	5 979 616 256	PAREC /CSPM-CCCM (SPI)	AOIO	14/01/2021	10/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
TOTAL			7 213 071 568							

PROJET D'APPUI A LA SCOLARISATION DANS LES ZONES D'EDUCATION PRIORITAIRES (PASZEP)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture des Ordinateurs pédagogiques destinés aux écoles du Projet PASZEP	AG	443 500 000	PASZEP /CSPM-CCCM (AG)	AONO	04/01/2021	05/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/10/2021
TOTAL			443 500 000							



PROJET D'APPUI AU DEVELOPEMENT DU CACAO (PAD CACAO)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des champs semenciers du MINADER	SPI	90 000 000	PAD-CACAO/CSPM	AONR	06/04/2021	28/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	30/09/2021
2	Acquisition des équipements et matériel de pollinisation manuelle	AG	30 000 000	PAD-CACAO/CSPM	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	24/05/2021
3	Acquisition de deux (02) véhicules pick-up	AG	50 000 000	PAD-CACAO/CSPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/06/2021
4	Acquisition du matériel informatique	AG	30 000 000	PAD-CACAO/CSPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	03/05/2021
TOTAL			200 000 000							

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II (PADY2)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture du matériel de pré-collecte –Engins	AG	59 623 808	PADY2 /CSPM	DC	08/01/2021	11/03/2021	12/04/2021	22/04/2021	21/07/2021
2	Fourniture des équipements bureautiques divers dans certains centre de santé publique de Yaoundé	AG	28 620 000	PADY2 /CSPM	DC	07/01/2021	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	31/05/2021
3	Fourniture des équipements techniques dans certain centre de santé publique de Yaoundé	AG	29 812 500	PADY2 /CSPM	DC	05/01/2021	28/01/2021	15/02/2021	25/02/2021	26/05/2021
4	Fourniture des équipements mécaniques des sept (07) communes d'arrondissement de Yaoundé pour le compte du PADY2	AG	1 073 249 984	PADY2 /CSPM-CCCM (AG)	AONR	07/01/2021	08/04/2021	10/05/2021	20/05/2021	18/08/2021
5	Audit comptable et financier des exercices 2019 2020 et 2021 du PADY2	SPI	35 775 000	PADY2 /CSPM	AONR	05/01/2021	06/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
6	Travaux de réhabilitation des centres de santé dans la ville de Yaoundé pour le compte du PADY2 (hôpitaux de la Cité verte, Efoulan et Elig Essono)	BEC	296 054 816	PADY2 /CSPM	AONR	08/01/2021	18/03/2021	19/04/2021	29/04/2021	27/08/2021
7	Travaux d'aménagement des voies piétonnes et fourniture des mobiliers urbains	ROUTES	205 110 000	PADY2 /CSPM	AONO	05/01/2021	08/03/2021	09/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
8	Assistance technique à la Communauté Urbaine de Yaoundé en vue de la mise place d'un observatoire et un réseau de stations hydrométéorologiques sur les bassins versants de la ville de Yaoundé	SPI	195 709 824	PADY2 /CSPM-CCCM (SPI)	GG			25/01/2021	08/02/2021	08/07/2021
9	Fourniture des équipements hydrométéorologiques	AG	87 057 344	PADY2 /CSPM	GG			25/01/2021	08/02/2021	25/03/2021
TOTAL			2 011 013 276							

PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYDROELECTRICITE SUR LE FLEUVE SANAGA (PATDHS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser le développement de l'hydrologie et l'étude sur le changement climatique dans le bassin du fleuve Sanaga	SPI	125 000 000	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR		05/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	21/01/2022
2	Recrutement d'un cabinet chargé de la définition et de la mise en œuvre d'une politique et d'une réglementation de la sécurité des barrages	SPI	150 000 000	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR		05/01/2021	08/02/2021	22/02/2021	19/11/2021
3	Recrutement du panel d'experts environnemental et socia	SPI	375 000 000	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR		23/12/2020	01/02/2021	15/02/2021	10/02/2023
4	Recrutement d'un cabinet chargé d'identifier les besoins des ressources humaines dans le secteur de l'hydroélectricité dans le moyen et long terme et développer une stratégie relative de renforcement des capacités	SPI	125 000 000	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	31/05/2021	04/10/2021	08/11/2021	22/11/2021	23/05/2022
5	Recrutement du panel d'experts techniques sécurité des barrages	SPI	375 000 000	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	GG CAS C			22/03/2021	05/04/2021	05/04/2023
6	Etude portant sur les modalités de mise en application du Décret N°2020/244 du 04 mai 2020	SPI	250 000 000	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	03/05/2021	06/09/2021	11/10/2021	25/10/2021	24/01/2022
7	Recrutement d'une assistance légale pour le Gouvernement du Cameroun dans le cadre de la construction de l'aménagement hydroélectrique de Nachtigal	SPI	340 812 000	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	08/02/2021	14/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	01/08/2024
8	Recrutement d'un Cabinet chargé de définir et mettre en place des mécanismes de mitigation du risque hydrologique	SPI	500 000 000	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	19/04/2021	23/08/2021	27/09/2021	11/10/2021	08/06/2022
9	Recrutement d'un cabinet conseil pour la supervision des travaux du projet hydroélectrique de Nachtigal sur la Sanaga	SPI	500 000 000	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	19/03/2021	23/07/2021	30/08/2021	13/09/2021	12/09/2024
TOTAL			2 740 812 000							

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DE BETAILS ET DES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE (PD-COBIE)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction et installation de trois (03) points d'approvisionnement en eau (points d'eau, forages et marres)	AI	79 044 600	PD-COBIE/CSPM	AONO	12/04/2021	02/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	22/11/2021
2	Acquisition de deux (02) groupes électrogènes au PD-COBIE	AG	40 000 000	PD-COBIE/CSPM	AONO	06/04/2021	25/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	15/11/2021
3	Construction de trois (03) centres zootechniques	BEC	90 000 000	PD-COBIE/CSPM	AONO	06/04/2021	25/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	15/11/2021
4	Acquisition des gadgets et des outils de publicité pour le PD-COBIE	AG	30 000 000	PD-COBIE/CSPM	AONO	12/01/2021	02/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
5	Recrutement d'un consultant pour accompagner le PD-COBIE dans l'organisation de campagne de communication sur le commerce du bétail dans les zones d'intervention du projet Recrutement d'un consultant pour accompagner le PD-COBIE dans l'organisation de campagne de communication sur le commerce du bétail dans les zones d'intervention du projet	SPI	30 000 000	PD-COBIE/CSPM	AONR	05/04/2021	28/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	16/08/2022
6	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure de fonctionnement des infrastructures d'élevage	SPI	21 000 000	PD-COBIE/CSPM	AONR	29/03/2021	21/06/2021	26/07/2021	09/08/2021	06/01/2022
7	Conception, installation, paramétrage et formation d'un logiciel de suivi/évaluation	SPI	11 000 000	PD-COBIE/CSPM	AONR	09/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	03/11/2021
8	Souscription d'une police d'assurance maladie, l'assistance à évacuation sanitaire et frais funéraires en faveur du personnel et des ayants droits du projets	SPI	20 000 000	PD-COBIE/CSPM	AONR	29/03/2021	21/06/2021	26/07/2021	09/08/2021	09/08/2022
9	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'assurance bétail au Cameroun	SPI	80 000 000	PD-COBIE/CSPM	AOIR	02/02/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	18/10/2021
10	Recrutement d'un service de consultant chargé de la maîtrise d'œuvre complète	SPI	1 789 728 640	PD-COBIE/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR		26/02/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/04/2022
11	Recrutement d'un consultant Auditeur financier	SPI	60 000 000	PD-COBIE/CSPM	AONR		22/02/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/06/2021
TOTAL			2 250 773 240							

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Entretien du matériel informatique et serveur de l'UCNP	SPI	7 200 000	PRODEL/CSPM	AONR	01/03/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	10/09/2021
2	Contrat de partenariat avec des organes de presse	SPI	5 000 000	PRODEL/CSPM	AONR	15/02/2021	10/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
3	Acquisition du mobilier de bureau complémentaire pour le compte de l'UCNP	AG	5 000 000	PRODEL/CSPM	DC	29/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/04/2021
4	Acquisition des équipements informatiques complémentaires pour le compte de l'UCNP	AG	18 000 000	PRODEL/CSPM	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	12/04/2021
5	Contractualisation des couvertures médiatiques	SPI	20 000 000	PRODEL/CSPM	AONR	21/05/2021	16/08/2021	20/09/2021	04/10/2021	03/01/2022
6	Acquisition des consommables informatiques complémentaires pour le compte de l'UCNP	AG	9 000 000	PRODEL/CSPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	09/04/2021
7	Relecture, production et impression magazine papier	SPI	20 000 000	PRODEL/CSPM	DC	07/05/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
8	Acquisition des fournitures de bureau complémentaires pour le compte de l'UCNP	AG	9 000 000	PRODEL/CSPM	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	16/04/2021
9	Acquisition d'une Connexion internet et intranet à l'UCNP	AG	8 000 000	PRODEL/CSPM	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	05/04/2021
10	Assurance maladie pour le compte du personnel de l'UCNP et de leurs ayants droits	SPI	47 000 000	PRODEL/CSPM	AONR	15/02/2021	10/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/06/2022
11	Assurance véhicules de l'UCNP	SPI	30 000 000	PRODEL/CSPM	AONR	01/02/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/06/2022

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Conception et diffusion des spots publicitaires	SPI	10 000 000	PRODEL/CSPM	AONR	12/04/2021	05/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	22/11/2021
13	Assurance multirisque pour le patrimoine de l'UCNP	SPI	5 000 000	PRODEL/CSPM	AONO	18/01/2021	09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	31/05/2022
14	Acquisition, installation et aménagement d'un conteneur pour l'archivage des documents du PRODEL (UCNP)	AG	20 000 000	PRODEL/CSPM	DC	22/03/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	21/06/2021
15	Recrutement d'un prestataire pour la sécurisation des locaux abritant l'Unité de Coordination du PRODEL	SPI	26 880 000	PRODEL/CSPM	AONR	01/02/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/06/2022
16	Acquisition des actifs productifs et autres matériels dans le cadre de la CERC	AG	850 000 000	PRODEL/CSPM-CCCM (AG)	AOIO	21/05/2021	20/09/2021	25/10/2021	08/11/2021	08/03/2022
17	Entretien des véhicules de l'UCNP	SPI	12 000 000	PRODEL/CSPM	AONO	23/03/2021	11/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	02/08/2022
18	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'infographiste-vidéaste-monteur pour une période de 12 mois	SPI	5 400 000	PRODEL/CSPM	AUTRE QUE	18/01/2021		18/01/2021	01/02/2021	01/02/2022
19	Acquisition carburant pour les équipes BF	AG	9 000 000	PRODEL/CSPM	DC	21/05/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	02/08/2021
20	Recrutement d'un Consultant pour l'appui à la mise en place d'un Système d'Archivage Numérique et Physique des documents du PRODEL	SPI	5 000 000	PRODEL/CSPM	GG	18/01/2021		18/01/2021	01/02/2021	03/05/2021
21	Acquisition matériels de collectes pour les équipes BF	AG	45 000 000	PRODEL/CSPM	DC	21/05/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	18/08/2021
22	Recrutement d'un Consultant pour l'Assistance Juridique du PRODEL	SPI	18 000 000	PRODEL/CSPM	AONR	15/03/2021	07/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	26/07/2021

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Recrutement d'un Cabinet pour la Mise en oeuvre de la stratégie de communication relative au marché des produits d'élevage	SPI	75 127 504	PRODEL/CSPM	AONR	10/05/2021	02/08/2021	06/09/2021	20/09/2021	20/12/2021
24	Acquisition matériels pour l'organisation des exercices de simulation des crises climatiques	AG	10 000 000	PRODEL/CSPM	DC	12/02/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/05/2021
25	Acquisition équipement pour le SI DEPCS	AG	35 000 000	PRODEL/CSPM	DC	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
26	Recrutement d'un cabinet pour renforcer les capacités d'organisation et d'opérationnalisation des COGES des Marché à Bétails (UCNP)	SPI	23 187 500	PRODEL/CSPM	AONR	01/02/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021
27	Acquisition du matériels roulants au profit des équipes des faitières	AG	30 000 000	PRODEL/CSPM	DC	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
28	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Appui à la mise en œuvre du programme national d'IA	SPI	120 000 000	PRODEL/CSPM-CCCM (SPI)	GG	01/02/2021		12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
29	Acquisition des équipements et matériels pour les Maisons des, éleveurs, les maisons des apiculteurs et le site de la foire	AG	50 000 000	PRODEL/CSPM	AONO	08/02/2021	30/04/2021	07/06/2021	21/06/2021	21/07/2021
30	Recrutement d'un cabinet pour produire des fiches techniques (UCNP)	SPI	5 843 250	PRODEL/CSPM	AONR	31/05/2021	23/08/2021	27/09/2021	11/10/2021	10/01/2022
31	Acquisition des fournitures pour la mise en place du dispositif de suivi des ressources fourragères et élaboration du bilan fourrager	AG	10 000 000	PRODEL/CSPM	DC	22/03/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	21/06/2021
32	Acquisition des équipements et formation des cadres de la DEPCS à l'utilisation	AG	10 000 000	PRODEL/CSPM	DC	15/03/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	28/05/2021
33	Recrutement d'un consultant individuel pour produire un recueil de documents légaux sur le pastoralisme (UCNP)	SPI	8 347 500	PRODEL/CSPM	GG	18/01/2021		10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
34	Achat de semence fourrager	AG	32 000 000	PRODEL/CSPM	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	19/04/2021
35	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie et le plan de mise en place des instances intercommunales de gestion des ressources pastorales communes y compris la transhumance (UCNP)	SPI	28 000 000	PRODEL/CSPM	AONR	14/06/2021	06/09/2021	11/10/2021	25/10/2021	24/01/2022
36	Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre de la CERC	SPI	150 000 000	PRODEL/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	22/03/2021	25/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	14/02/2022
37	Transport d'animaux	SPI	29 000 000	PRODEL/CSPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	16/04/2021
38	Recrutement consultant pour l'élaboration d'un référentiel technico-économique et édition	SPI	15 000 000	PRODEL/CSPM	GG	18/01/2021		15/02/2021	01/03/2021	31/05/2021
39	Aliments porcins	AG	30 000 000	PRODEL/CSPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	03/05/2021
40	Recrutement d'un consultant international pour l'appui à l'organisation des exercices de simulation des crises climatiques	SPI	17 500 000	PRODEL/CSPM	GG	18/01/2021		15/02/2021	01/03/2021	31/05/2021
41	Géniteur de 100 porcins	AG	11 000 000	PRODEL/CSPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
42	Recrutement des consultants pour la structuration des organisations faitières	SPI	75 000 000	PRODEL/CSPM	GG	18/01/2021		19/04/2021	03/05/2021	01/11/2021
43	Acquisition de 165 Génisses	AG	585 000 000	PRODEL/CSPM-CCCM (AG)	AONO	01/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/09/2021
44	Acquisition et installation du matériel informatique, d'un serveur et d'un dispositif photovoltaïque pour énergie solaire pour le compte du RESCAM	AG	20 000 000	PRODEL/CSPM	DC	02/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
45	Recrutement d'un cabinet de contrôle	SPI	17 500 000	PRODEL/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	23/03/2021	15/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	01/11/2021
46	Recrutement des consultants pour la formation et l'accompagnement des producteurs	SPI	125 000 000	PRODEL/CSPM	SAUTRE QUE	01/02/2021		09/02/2021	25/02/2021	24/08/2021
47	Fourniture de dispositifs de lutte antivectorielle en faveur des CLAV	AG	60 000 000	PRODEL/CSPM	AONO	19/02/2021	10/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
48	Recrutement des institutions pour les stages et les formations des spécialistes	SPI	75 000 000	PRODEL/CSPM	GG	18/01/2021		08/02/2021	22/02/2021	23/08/2021
49	Caractérisation des Agents Causaux Responsables de la fièvre aphteuse au Cameroun	SPI	10 000 000	PRODEL/CSPM	AONR	08/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/07/2021
50	Recrutements des Institutions pour les stages et les formations spécialisées	SPI	24 000 000	PRODEL/CSPM	SAUTRE QUE	18/01/2021		08/02/2021	22/02/2021	24/05/2021
51	Fourniture de supports de campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants pour le compte de l'année 2021	AG	15 000 000	PRODEL/CSPM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	10/05/2021
52	Recrutement d'un consultant pour le diagnostic des filières porcines et avicoles et élaboration d'un Plan de renforcement des capacités	SPI	32 000 000	PRODEL/CSPM	GG	18/01/2021		15/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
53	Acquisition d'une flotte de communication dans le cadre du Système d'Information de la Direction de la Santé Vétérinaire (SI/DSV)	AG	50 000 000	PRODEL/CSPM	AONO	18/01/2021	09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
54	Fourniture d'un serveur et d'un dispositif photovoltaïque pour énergie solaire	AG	15 000 000	PRODEL/CSPM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/06/2021
55	Organisation des stages/formations pratiques pour les formateurs cadres du MINEPIA et du secteur privé	SPI	13 500 000	PRODEL/CSPM	AONR	01/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
56	Fourniture des vaccins pour la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants pour le compte de l'année 2021	AG	335 000 000	PRODEL/CSPM-CCM (AG)	AONO	08/03/2021	07/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	25/10/2021
57	Fourniture de 360 000 doses de vaccins dans le cadre du contrôle de la fièvre aphteuse dans les bassins laitiers	AG	900 000 000	PRODEL/CSPM-CCM (AG)	AONO	08/03/2021	07/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	25/10/2021
58	Fourniture et installation d'une autoclave et du matériel de froid au LANAVET	AG	300 000 000	PRODEL/CSPM-CCM (AG)	AONO	08/03/2021	07/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	22/11/2021
59	Conception fourniture et installation d'un dispositif photovoltaïque pour production d'énergie solaire au LANAVET (site de Garoua)	AI	445 000 000	PRODEL/CSPM	AOIO	22/02/2021	11/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	29/11/2021
60	Recrutement d'un Centre/ Institutions de formations spécialisées pour des formations Master	SPI	14 700 000	PRODEL/CSPM	AONR	22/02/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
61	Fourniture du matériel de travail aux Responsables des Unités Opérationnelles au MINEPIA	AG	180 000 000	PRODEL/CSPM	AONO	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
62	Fourniture de matériel devant servir aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité aux acteurs de la filière viande	AG	62 500 000	PRODEL/CSPM	AONO	18/01/2021	09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
63	Etude de faisabilité d'un Projet à énergie solaire au LANAVET Garoua	SPI	5 000 000	PRODEL/CSPM	AONR	22/02/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
64	Travaux d'Aménagement du site de la foire	BEC	350 000 000	PRODEL/CSPM	AONO	23/03/2021	11/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	28/01/2022
65	Petits travaux de réhabilitation de l'immeuble abritant les bureaux de l'UCNP	BEC	8 000 000	PRODEL/CSPM	AONO	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
TOTAL			5 591 685 754							


PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un consultant (firme) pour l'audit technique des activités du PDVIR	SPI	29 015 000	MINHDU/CSPM	AONR	01/06/2021	23/07/2021	13/08/2021	27/08/2021	29/12/2023
2	Recrutement d'un Conseiller principal à la CC du PDVIR	SPI	18 932 868	MINHDU/CSPM	AONR	15/03/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	27/09/2021
3	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des PAR des sous projets pilote de mobilité piétonne dans la ville de Yaoundé	SPI	17 916 182	MINHDU/CSPM	AONR	15/03/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	27/09/2021
4	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des EIES des sous projets pilote de mobilité piétonne dans la ville de Yaoundé	SPI	9 953 886	MINHDU/CSPM	AONR	08/03/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/02/2022
5	Recrutement d'un consultant pour la finalisation des études APS/APD/DAO en vue des travaux de préservation de la capacité de drainage et d'adaptation naturelle au changement climatique dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri et Ngaoundéré	SPI	5 963 743	MINHDU/CSPM	AONR	01/03/2021	04/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	03/02/2022
6	Recrutement de l'ONG internationale chargée de l'opérationnalisation et du suivi de mise en œuvre du manuel d'appui aux initiatives jeunes	SPI	149 304 807	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	16/03/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	28/10/2021
7	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES des sous projets de proximité dans les villes de Kousséri et Maroua	SPI	9 953 886	MINHDU/CSPM	AONR	19/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	03/11/2021
8	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des PAR des sous projets de proximité dans la ville de Yaoundé	SPI	13 935 324	MINHDU/CSPM	AONR	19/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	03/11/2021
9	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des PAR des sous projets de proximité dans la ville de Douala	SPI	13 935 324	MINHDU/CSPM	AONR	22/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	28/10/2021
10	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Kousséri et Maroua	SPI	13 935 324	MINHDU/CSPM	AONR	22/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	03/11/2021
11	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Batouri et Ngaoundéré	SPI	13 935 324	MINHDU/CSPM	AONR			19/02/2021	05/03/2021	21/08/2023

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Maroua	SPI	124 249 774	MINHDU/CSPM-CCCM(Routes)	AONR			22/02/2021	08/03/2021	21/08/2023
13	Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux d'aménagement de proximité à Ngaoundéré 2ème	SPI	115 844 709	MINHDU/CSPM-CCCM(Routes)	AONR			19/02/2021	05/03/2021	17/08/2023
14	Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Batouri	SPI	63 098 921	MINHDU/CSPM	AONR	08/03/2021	11/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	21/03/2022
15	Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Douala 3ème et 5ème	SPI	361 420 705	MINHDU/CSPM-CCCM(Routes)	AONR	22/02/2021	28/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	07/03/2022
16	Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Yaoundé 5ème et 7ème	SPI	316 242 609	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	16/03/2021	08/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	25/03/2022
17	Recrutement d'un consultant spécialisé VBG pour appuyer la CCP dans la préparation et la mise en œuvre des activités de VBG	SPI	71 666 470	MINHDU/CSPM	AONR			15/02/2021	01/03/2021	28/02/2023
18	Contrôle et Surveillance pour la réalisation de travaux de voiries, et ouvrages de drainage structurants dans les Arrondissements de Douala 3ème et 5ème	SPI	1 038 918 054	MINHDU/CSPM-CCCM(Routes)	AONR			29/01/2021	12/02/2021	30/09/2022
19	Contrôle et Surveillance pour la Réalisation de travaux de voiries structurantes dans la Ville de Yaoundé (CAY5 et CAY7)	SPI	628 813 660	MINHDU/CSPM-CCCM(Routes)	AONR			10/02/2021	25/02/2021	28/12/2021
20	Elaboration du bilan de la politique de contractualisation (CDV MINHDU/CTD, stratégie d'intervention et guide méthodologique)	SPI	99 400 167	MINHDU/CSPM	AONR	02/03/2021	04/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	28/12/2021
21	Mise en place d'un système d'archivage électronique à la DOU	SPI	149 304 807	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/03/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/01/2022
22	Etude sur les méthodes d'aménagement concerté en zone urbaine dense et dans les zones d'extension urbaine	SPI	99 400 167	MINHDU/CSPM	AONR	22/03/2021	25/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	18/01/2022
23	Elaboration d'un Plan de secteur dans la Commune de Ngaoundéré 2	SPI	124 420 962	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	23/03/2021	25/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	18/01/2022

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
24	Assainissement des comptes des communes (Ba, CAD3, CAD5, CUN, CAN1, CAN2, CAN3, CAY5, CAY7, Ko)	SPI	204 050 309	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	01/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/11/2021
25	Valorisation de l'étude "Etat des lieux des équipements marchands" dans l'objectif d'une programmation raisonnée des interventions et des améliorations de gestion à Douala	SPI	99 536 538	MINHDU/CSPM	AONR	15/03/2021	18/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	11/01/2022
26	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Douala	SPI	149 304 807	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/03/2021	18/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	11/01/2022
27	Inventaire de la programmation des équipements marchands des villes de Ngaoundéré et Yaoundé	SPI	194 096 423	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	29/03/2021	01/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	25/01/2022
28	Appui à l'actualisation de l'adressage et à la mise en place d'applicatifs (campagne de communication, applicatif de gestion urbaine, taxes) à Yaoundé	SPI	149 304 807	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	13/04/2021	15/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	04/10/2021
29	Recrutement d'un Consultant (convention avec WWF) pour la formation des UTL, des élèves, riverains, professionnels, OSC et autorités en vue des travaux de préservation de la capacité de drainage et d'adaptation naturelle au changement climatique (Ba, CAD3, CAD5, CAN2, CAY5, CAY7)	SPI	29 819 876	MINHDU/CSPM	GG			15/03/2021	29/03/2021	29/03/2022
30	Recrutement d'un Consultant (convention) pour la formation en groupes sur sites	SPI	149 304 807	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	GG			15/04/2021	29/04/2021	13/09/2021
31	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de secteur (PS) à Douala 3 (Ndougpassi) et Douala 5 (Beedi)	SPI	261 135 000	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR			15/04/2021	29/04/2021	30/08/2021
32	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de secteur (PS) à Yaoundé 5 (Nkolmesseng) et Yaoundé 7 (Oyomabang)	SPI	220 514 000	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR			15/04/2021	29/04/2021	26/01/2022
33	Appui à la confection des fichiers de contribuables des communes de Ngaoundéré y compris informatisation (CUN, CAN1, CAN2, CAN3)	SPI	76 147 546	MINHDU/CSPM	AONR	22/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	19/01/2022
34	Evaluation de l'opération « fichiers des contribuables » réalisée par le PDUE dans les six Communes de Douala, les sept Communes de Yaoundé et orientation	SPI	99 400 167	MINHDU/CSPM	AONR	19/04/2021	28/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	15/10/2021

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
35	Evaluation de la capacité de réponse des communes à la crise sanitaire liée au Covid-19	SPI	11 944 315	MINHDU/CSPM	AONR		08/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	02/02/2022
36	Elaboration des plans d'organisation et des effectifs (POE) y compris manuels de procédures de certaines municipalités de Batouri, Douala, Kousséri, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé	SPI	129 220 043	MINHDU/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	06/04/2021	08/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	22/11/2021
37	Appui à la préparation des contrats de ville de Maroua et de Kousséri	SPI	59 721 575	MINHDU/CSPM	AONR	29/03/2021	01/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	18/10/2021
38	Fourniture d'un bulletin trimestriel d'information sur le Projet	AG	58 030 000	MINHDU/CSPM	AONO	23/03/2021	25/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	26/08/2021
39	Fourniture et pose des babillards dans les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de ressort du projet	AG	41 089 882	MINHDU/CSPM	AONO	12/01/2021	02/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	08/07/2021
40	Acquisition du matériel informatique pour la Cellule de Coordination (CC), les Unités Techniques de Liaison (UTL) et les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) ou mairies concernées par le projet	AG	248 500 128	MINHDU/CSPM	AONO	22/02/2021	27/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/08/2021
41	Fourniture de supports de communication et couverture médiatique du PDVIR	AG	24 883 844	MINHDU/CSPM	AONO	08/02/2021	13/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
42	Acquisition de GPS bi-fréquence au profit des délégations : Acquisition de GPS bi-fréquence au profit des délégations départementales du MINDCAF (Kadey, Logone et Chari, Diamare Vina)ns départementales du MINDCAF (Kadey, Logone et Chari, Diamare Vina)	AG	79 629 346	MINHDU/CSPM	AONO			15/03/2021	29/03/2021	14/06/2021
43	Fourniture d'un drone professionnelle et d'une plateforme photogrammétrique au MINDCAF	AG	120 898 541	MINHDU/CSPM	AONO	22/03/2021	25/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	10/09/2021
44	Appui à l'équipement en matériel d'archivage des CTD	AG	149 304 807	MINHDU/CSPM	AONO	22/03/2021	25/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	10/09/2021
45	Appui à l'équipement en matériels d'hygiène et de salubrité au profit des Comités de Développement des Quartiers (CDQ) et autres associations dans les communes	AG	79 623 543	MINHDU/CSPM	AONO	09/04/2021	14/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	01/10/2021

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
46	Réalisation des travaux d'ouvrages de drainage structurants dans les Arrondissements de Douala 3ème et 5ème	ROUTES	12 632 331 264	MINH DU/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO			29/01/2021	12/02/2021	18/07/2022
47	Réalisation des travaux de voiries structurants dans les Arrondissements de Douala 3ème et 5ème	ROUTES	9 776 418 816	MINH DU/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO			01/02/2021	15/02/2021	20/07/2022
48	Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la Ville de Yaoundé (CAY5 et CAY7)	ROUTES	15 815 201 792	MINH DU/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO			29/01/2021	12/02/2021	30/09/2022
TOTAL			44 348 974 850							

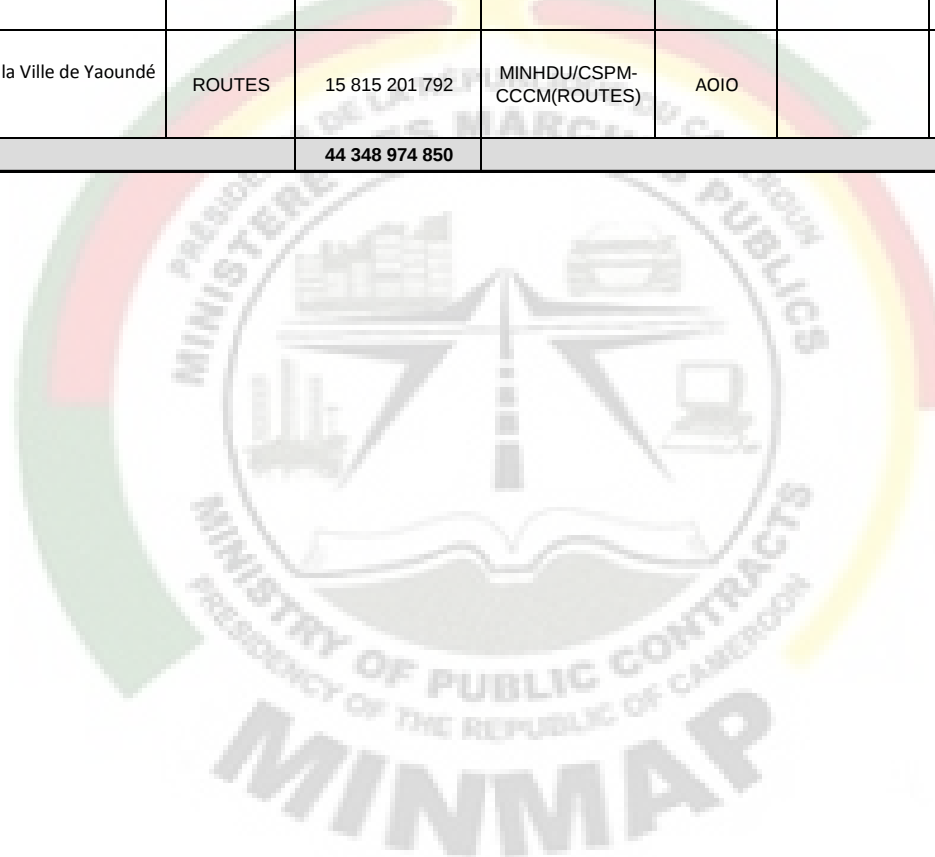

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS -VOLET AERIEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un Consultant chargé de l'audit externe du PDST pour les exercices 2020, 2021 et 2022	SPI	45 000 000	PDST/CSPM	AONR	22/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	15/06/2022
2	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan succinct de réinstallation dans le cadre des travaux de Construction de la cloture de sécurité de ,l'Aéroport international de Yaoundé Nsimalen	SPI	10 000 000	PDST/CSPM	CI			28/01/2021	11/02/2021	29/03/2021
3	Recrutement d'un consultant individuel pour contrôle et surveillance des travaux de construction des salles de classe et des forages pour les populations autour de l'aéroport international de Maroua	SPI	9 100 000	PDST/CSPM	CI			24/08/2021	09/09/2021	07/12/2021
4	Contrôle et surveillance des travaux de Construction de la cloture de sécurité de ,l'Aéroport international de Yaoundé Nsimalen	SPI	200 000 000	PDST/CSPM-CCCM(BEC)	AONR	12/02/2021	21/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	12/07/2022
5	Recrutement d'un consultant individuel pour contrôle et surveillance des travaux de construction des salles de classe et des forages pour les populations autour de l'aéroport international de Maroua	SPI	9 100 000	PDST/CSPM	CI			24/08/2021	09/09/2021	07/12/2021
6	Recrutement d'un consultant individuel pour contrôle et surveillance des travaux de construction des salles de classe et des forages pour les populations autour de l'aéroport international de Garoua	SPI	9 500 000	PDST/CSPM	CI			24/08/2021	09/09/2021	07/12/2021
7	Recrutement d'un consultant individuel pour contrôle et surveillance des travaux de construction des salles de classe et des forages pour les populations autour de l'aéroport international de Douala	SPI	7 000 000	PDST/CSPM	CI			25/08/2021	09/09/2021	07/12/2021
8	Recrutement d'un consultant individuel pour contrôle et surveillance des travaux de construction des salles de classe et des forages pour les populations autour de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen	SPI	13 400 000	PDST/CSPM	CI			24/08/2021	09/09/2021	07/12/2021
9	Etudes et suivi de la fourniture, installation et mise en service d'un système intégré de sûreté dans les aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua Salak.	SPI	30 000 000	PDST/CSPM	CI			07/06/2021	21/06/2021	14/10/2022

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS -VOLET AERIEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Réalisation des documentaires et constitution d'une banque d'images : communication et relation publiques	AG	22 000 000	PDST/CSPM	DC	26/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/04/2022
11	Construction de la clôture de sécurité de ,l'Aéroport international de Yaoundé Nsimalen	BEC	3 000 000 000	PDST/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	29/03/2021	28/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	16/08/2022
12	Etude pour la mise en place d'un cadre organisationnel et opérationnel de la supervision économique du transport aérien au Cameroun	SPI	141 000 000	PDST/CSPM	AONR	08/02/2021	13/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	13/12/2021
13	Etude pour la réalisation d'un plan stratégique de développement du transport aérien au Cameroun à l'horizon 2035	SPI	50 000 000	PDST/CSPM	AONR	22/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	24/05/2021
14	Recrutement d'un consultant pour l'organisation d'un exercice de crise de sûreté à l'aviation civile	SPI	35 750 000	PDST/CSPM	AONR	09/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	13/12/2021
15	Contrôle et surveillance des travaux de construction du pont	SPI	60 000 000	PDST/CSPM	AONR	09/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	06/06/2022
16	Recrutement d'une ONG pour la fourniture de services multisectoriels de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre dans le cadre des activités du PDST -VA	SPI	60 000 000	PDST/CSPM	AONR	26/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
17	Etudes techniques des travaux de construction d'un pont sur la route de contournement de l'aéroport de Yaoundé_Nsimalen	SPI	100 000 000	PDST/CSPM-CCCM(Routes)	AONR	16/11/2020	19/01/2021	08/02/2021	22/02/2021	24/03/2021
18	Contrôle et Surveillance des travaux d'aménagement de la route de patrouille et réhabilitation de la clôture de sûreté de l'aéroport de Douala	SPI	365 000 000	PDST/CSPM-CCCM(Routes)	AONR	28/09/2020	01/12/2020	21/12/2020	07/01/2021	13/06/2022
19	Gardiennage jour/nuit du bâtiment de CDOU de Yaoundé Nsimalen pour une durée de 12 mois	SPI	7 140 000	PDST/CSPM	DC	28/12/2020	22/01/2021	12/02/2021	26/02/2021	03/03/2022

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS -VOLET AERIEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
20	Maintenance du matériel informatique du PDST-VA pour une durée de 12 mois	SPI	5 000 000	PDST/CSPM	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	03/05/2022
21	Entretien du parc automobile du Projet pour une durée de 12 mois	SPI	10 000 000	PDST/CSPM	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	03/05/2022
22	Fourniture, installation et mise en service d'un système intégré de sûreté dans les aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua Salak.	AG	6 449 999 872	PDST/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	15/10/2021	14/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	13/06/2022
23	Fourniture des tables bancs pour les écoles concernées par le Projet autour de l'aéroport international de Maroua	AG	35 500 000	PDST/CSPM	DC	25/05/2021	18/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	20/12/2021
24	Fourniture des tables bancs pour les écoles concernées par le Projet autour de l'aéroport international de Douala	AG	6 100 000	PDST/CSPM	DC	25/05/2021	18/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	10/12/2021
25	Fourniture des tables bancs pour les écoles concernées par le Projet autour de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen	AG	19 500 000	PDST/CSPM	DC	25/05/2021	18/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	30/12/2021
26	Acquisition des équipements du CDOU de Garoua et de maroua en deux lots séparés	AG	664 000 000	PDST/CSPM	AONO	12/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	13/12/2021
27	Acquisition des équipements du CDOU de Yaoundé	AG	407 000 000	PDST/CSPM-CCCM(AG)	AONO	12/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	13/12/2021
28	Construction des forages pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Maroua	AI	53 000 000	PDST/CSPM	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/12/2021
29	Construction des forages pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Garoua	AI	54 000 000	PDST/CSPM	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/12/2021

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS -VOLET AERIEN										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
30	Construction des forages pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Douala	AI	23 000 000	PDST/CSPM	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	11/01/2022
31	Construction des forages pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen	AI	12 000 000	PDST/CSPM	AONO	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/12/2021
32	Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Maroua	BEC	48 000 000	PDST/CSPM	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/12/2021
33	Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Garoua	BEC	38 000 000	PDST/CSPM	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/12/2021
34	Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Douala	BEC	40 000 000	PDST/CSPM	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/12/2021
35	Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	BEC	72 000 000	PDST/CSPM	AONO	23/02/2021	12/04/2021	09/04/2021	03/05/2021	17/05/2021
36	Travaux de construction d'un pont (y compris les accès) sur la voie de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen	AI	700 000 000	PDST/CSPM	AONO	11/05/2021	30/07/2021	06/09/2021	20/09/2021	17/06/2022
37	Aménagement de la route de patrouille et réhabilitation de la clôture de sûreté de l'aéroport de Douala	ROUTES	5 800 000 000	PDST/CSPM-CCCM(Routes)	AQIO	31/08/2020	28/12/2020	01/02/2021	15/02/2021	30/06/2022
TOTAL			18 611 089 872							

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements Informatiques et bureautique au lycée technique de OMBE	AG	189 891 536	PEST/CIPM	AONO	15/04/2021	05/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	05/04/2022
2	Construction d'une ligne d'alimentation électrique MT au CETIC de Nsam	AI	13 000 000	PEST/CIPM	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	29/04/2021
3	Fourniture et installation mise en service d'un groupe électrogène au lycée technique de OMBE Lot 1	AG	40 000 000	PEST/CIPM	AONO	14/06/2021	03/09/2021	11/10/2021	25/10/2021	21/02/2022
4	Fourniture et installation mise en service de deux véhicules au lycée technique de OMBE Lot 2		60 000 000							
5	Formateur des formateurs au lycée technique de OMBE	SPI	110 000 000	PEST/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	15/02/2021	21/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	12/07/2022
6	Fourniture,installation,mise en service et formation des utilisateurs des équipements des filières Techniques industrielles anciennes au lycée technique de OMBE Lot 1	AG	800 000 000	PEST/CIPM-CCCM(AG)	AONO	16/04/2021	16/07/2021	23/08/2021	06/09/2021	03/06/2022
7	Fourniture,installation,mise en service et formation des utilisateurs des équipements des filières Techniques industrielles anciennes au lycée technique de OMBE Lot 2		300 000 000							
TOTAL			1 512 891 536							

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE SECTEUR MINIER (PRECASEM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier du bureau pour le MINMIDT	AG	82 911 000	PRECASEM/ CSPM	AONO	31/05/2021	03/08/2021	06/09/2021	20/09/2021	30/11/2021
2	Acquisition du matériel et des équipements bureautiques pour le MINMIDT	AG	110 548 000	PRECASEM/ CSPM	AONO	31/05/2021	03/08/2021	06/09/2021	20/09/2021	30/11/2021
3	Réalisation d'une campagne de formation/sensibilisation des artisans mineurs dans les sites du Nord et de l'Adamaoua	SPI	69 092 496	PRECASEM/ CSPM	AONR	23/04/2021	29/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	30/11/2021
4	Réalisation d'une campagne de formation/sensibilisation des artisans mineurs dans les sites de l'Est I	SPI	55 274 000	PRECASEM/ CSPM	AONR	23/04/2021	29/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	30/11/2021
5	Réalisation d'une campagne de formation/sensibilisation des artisans mineurs dans les sites de l'Est II	SPI	69 092 496	PRECASEM/ CSPM	AONR	23/04/2021	29/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	30/11/2021
6	Réalisation d'une campagne de formation/sensibilisation des artisans mineurs dans les sites du Centre, Littoral et Sud	SPI	82 911 000	PRECASEM/ CSPM	AONR	23/04/2021	29/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	30/11/2021
7	Supervision du programme complémentaire de cartographie géologique et géochimique : prospection géochimique	SPI	110 548 000	PRECASEM/ CSPM-CCCM(SPI)	GG	30/06/2021		09/08/2021	23/08/2021	30/11/2021
8	Supervision du programme complémentaire de cartographie géologique et géochimique : levées géologiques	SPI	110 548 000	PRECASEM/ CSPM-CCCM(SPI)	GG	30/06/2020		10/08/2020	24/08/2020	30/11/2020
9	Acquisition de matériel et équipement pour le MINMIDT	AG	359 280 992	PRECASEM/ CSPM-CCCM(AG)	AONO	31/05/2021	02/08/2021	06/09/2021	20/09/2021	30/11/2021
TOTAL			1 050 205 984							


PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION (PRERETD)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement de l'auditeur externe des projets PRERETD et PAHLP pour les exercices 2021 et 2022	SPI	30 000 000	EDC/CIPM	AOIR	05/07/2021	26/10/2021	29/11/2021	13/12/2021	29/09/2023
2	Acquisition des IACM, Coupe circuit à fusible à expulsion et Poteaux bétons	AG	150 000 000	EDC/CIPM	AONO	12/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	17/12/2021
3	Finalisation des travaux de construction de la ligne 90 KV MINLAMIZIBI - EBOLOWA et du génie civil du poste 90/30/15KV d'EBOLOWA	AI	749 000 000	EDC/CIPM	AONO	12/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	17/12/2021
4	Travaux de construction des réseaux MT/BT dans la Région du Sud Cameroun	AI	905 000 000	EDC/CIPM	AONO		22/02/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/10/2021
5	Travaux de construction des réseaux MT/BT dans la Région du Centre	AI	294 000 000	EDC/CIPM	AONO		22/02/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/10/2021
6	Travaux d'ouverture de corridor pour construction des réseaux MT/BT dans la Région du SUD Cameroun	AI	520 000 000	EDC/CIPM	AONO		22/02/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/10/2021
TOTAL			2 648 000 000							

PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE PHASE II (PER II)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Exécution des travaux d'électrification rurale dans certaines localités de la Région de l'OUEST (fourniture transport et montage) Lot 4	AG	1 075 516 049	AER/PER II/ CSPM-CCCM(AG)	AOIO	En cours d'exécution				20/08/2021
2	Exécution des travaux d'électrification rurale dans certaines localités des Régions du CENTRE et du SUD (Fourniture transport et montage) Lot 2	AG	3 100 369 099	AER/PER II/ CSPM-CCCM(AG)	AOIO	En cours d'exécution				19/01/2022
3	Exécution des travaux d'électrification rurale dans certaines localités de la Région du NORD (Fourniture transport et montage) Lot 3	AG	7 526 928 109	AER/PER II/ CSPM-CCCM(AG)	AOIO	En cours d'exécution				28/09/2021
4	Exécution des travaux d'électrification rurale dans certaines localités de la Région de l'Adamaoua (Fourniture transport et montage) Lot 1	AG	7 438 091 649	AER/PER II/ CSPM-CCCM(AG)	AOIO	En cours d'exécution				28/09/2021
TOTAL			19 140 904 906							

PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES (PIDMA)										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction de deux (02) forages équipés de PMH à Ndom	AI	35 775 000	PIDMA/CSPM	AONO	28/01/2021	29/03/2021	30/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
2	Traitement sur les points critiques des routes rurales dans la région du Centre et du Littoral	ROUTES	119 250 000	PIDMA/CSPM	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
3	Travaux confortatifs sur le dalot de l'usine de CROPSEC de Maroua et contrôle	ROUTES	26 925 000	PIDMA/CSPM	AONO	28/01/2021	29/03/2021	30/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
4	Recrutement d'un prestataire pour la réalisation de l'archivage numérique et logique au PIDMA	SPI	35 775 000	PIDMA/CSPM	AONO	29/01/2021	15/03/2021	16/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
5	Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser l'audit externe du PIDMA pour les exercices 2020 et 2021	SPI	14 310 000	PIDMA/CSPM	AONR	15/01/2021	08/03/2021	09/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
6	Recrutement du prestataire pour l'entretien de 07 (sept) véhicules du PIDMA	SPI	46 209 168	PIDMA/CSPM	AONO	22/01/2021	08/03/2021	09/04/2021	19/04/2021	28/07/2021
7	Acquisition des pneus pour 07 (sept) véhicules	AG	15 443 054	PIDMA/CSPM	DC	22/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	29/04/2021
8	Achat des fournitures de bureau pour l'exercice 2021	AG	32 197 828	PIDMA/CSPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	10/05/2021
9	Acquisition des consommables informatiques pour l'exercice 2021	AG	33 390 240	PIDMA/CSPM	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	19/04/2021
TOTAL			359 275 290							

STADE C2D										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Evaluation du Programmes "PMEAA"	SPI	25 000 000	STADE C2D / CIPM	AONO	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
2	Audit Comptable et Financier du programme PAGFI 2	SPI	40 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	27/04/2021	20/07/2021	23/08/2021	06/09/2021	05/11/2021
3	Evaluation du Programmes "Formation Professionnelle"	SPI	25 000 000	STADE C2D / CIPM	AONO	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
4	Audit Technique du programme C2D Santé 1	SPI	25 000 000	STADE C2D / CIPM	AONO	22/07/2021	20/09/2021	22/10/2021	01/11/2021	10/01/2022
5	Evaluation rétrospective de l'ABS 3ème C2D – triennat 2017-2019 et l'évaluation préliminaire de l'ABS 2020-2022	SPI	50 000 000	STADE C2D / CIPM	AONO	31/05/2021	20/08/2021	27/09/2021	11/10/2021	10/01/2022
6	Audit Comptable et Financier du programme C2D Culture 2019/2022	SPI	50 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	27/04/2021	20/07/2021	23/08/2021	06/09/2021	26/10/2021
7	Audit Comptable et Financier sur les opérations sur financement C2D effectués par la CAA au cours des exercices 2018 à 2021	SPI	90 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	12/01/2021	06/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
8	Audit technique, comptable et financier du programme Capitales Régionales 2 2019/2023 et fin	SPI	150 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	07/06/2021	10/09/2021	18/10/2021	01/11/2021	31/01/2022
9	Audit Comptable et financier des programmes C2D PILOTAGE 1, C2D TRANSVERSAL, C2D PILOTAGE 3 et C2D FATEP, exercices 2021/2024	SPI	80 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	31/05/2021	23/08/2021	27/09/2021	11/10/2021	10/01/2022
10	Audit de clôture des comptes des programmes C2D	SPI	80 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	31/05/2021	23/08/2021	27/09/2021	11/10/2021	10/01/2022
11	Etude de faisabilité de l'Agence Nationale du Conseil Agropastoral.	SPI	150 000 000	STADE C2D / CIPM -CCCM (SPI)	AOIR	11/06/2021	15/10/2021	22/11/2021	06/12/2021	07/03/2022
12	Audit Comptable et financier du Programme C2D BUNEC 2020-2024	SPI	50 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	31/05/2021	23/08/2021	27/09/2021	11/10/2021	10/12/2021

STADE C2D										
N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Audit Comptable et Financier de la Société Civile 2019/2020	SPI	30 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	12/01/2021	06/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	09/08/2021
14	Audit technique de l'Appui Budgétaire Sectoriel deuxième triennal 2020/2022	SPI	50 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	27/04/2021	20/07/2021	23/08/2021	06/09/2021	06/12/2021
15	Audit Comptable et financier des dépenses effectuées sur le compte bancaire C2D URBAIN/MINH DU (CAA-C2D études centres urbains régionaux)	SPI	30 000 000	STADE C2D / CIPM	AONR	14/05/2021	09/07/2021	30/07/2021	13/08/2021	11/11/2021
TOTAL			925 000 000							

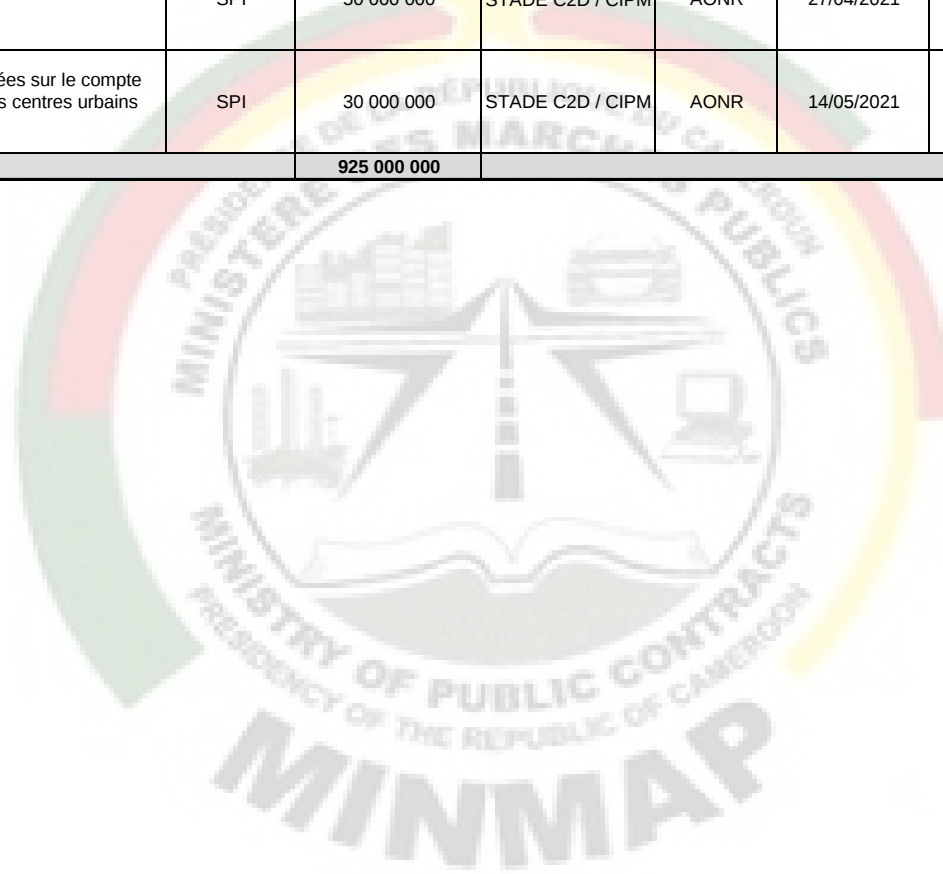



REGION DU SUD-OUEST

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN FOR DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)										
No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	Construction of two cocoa grinding units	BPA	1 097 938 944	OIVDP/ITB-CCTB(BPA)	ONIT	23/07/2021	01/10/2021	01/11/2021	11/11/2021	11/11/2022
2	Supply of equipment to double classroom blocks	GP	53 558 000	OIVDP/ITB	ONIT	31/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	31/05/2021
3	Supply of equipment for 7 health centres	GP	112 471 800	OIVDP/ITB	ONIT	08/04/2021	07/06/2021	09/07/2021	19/07/2021	18/10/2021
4	Construction of SWAVIB Head office	BPA	267 790 000	OIVDP/ITB	ONIT	28/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2022
5	Construction of 30 village banks	BPA	321 348 000	OIVDP/ITB	ONIT	11/01/2021	15/03/2021	16/04/2021	26/04/2021	26/04/2022
6	Construction of 10 double classroom blocks	BPA	214 232 000	OIVDP/ITB	ONIT	18/11/2021	20/12/2021	06/01/2022	17/01/2022	17/01/2023
7	Protection of 50 water catchment	OI	80 337 000	OIVDP/ITB	ONIT	29/10/2021	30/12/2021	31/01/2022	10/02/2022	10/02/2023
8	Construction and Rehabilitation of thirty two (32) water schemes	OI	1 371 084 800	OIVDP/ITB-CCTB(OI)	ONIT	08/03/2021	21/05/2021	21/06/2021	01/07/2021	03/07/2023
9	Construction of two palm oil units	BPA	1 646 908 544	OIVDP/ITB-CCTB(OI)	ONIT	18/01/2021	02/04/2021	03/05/2021	13/05/2021	13/05/2022
10	Construction of two warehouses for potatoes	BPA	160 679 008	OIVDP/ITB	ONIT	02/07/2021	02/09/2021	04/10/2021	14/10/2021	14/10/2022
11	Construction of 250m bridges	ROAD	1 338 950 016	OIVDP/ITB	RIIT	30/09/2021	06/01/2022	07/02/2022	17/02/2022	17/02/2023
12	Project Management of Construction of 250m bridges	ISC	1 735 279 257	OIVDP/ITB	RIIT	08/10/2021	24/12/2021	24/01/2022	03/02/2022	06/03/2023

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN FOR DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)										
No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
13	Construction of irrigation network in 200hc of arable land	OI	1 928 088 064	OIVDP/ITB-CCTB(OI)	RNIT	23/07/2021	08/10/2021	08/11/2021	18/11/2021	20/11/2023
14	Consultancy for mid-term review	ISC	26 779 000	OIVDP/ITB	RNIT	22/02/2021	01/04/2021	19/04/2021	29/04/2021	28/07/2021
15	Selection of consultant for Islamic finance	ISC	230 299 392	OIVDP/ITB	RNIT	19/03/2021	04/06/2021	05/07/2021	15/07/2021	15/07/2022
16	Supply of rice hauling mill	GP	415 079 488	OIVDP/ITB-CCTB(GP)	ONIT	16/08/2021	29/10/2021	29/11/2021	09/12/2021	09/03/2022
17	Supply of Cocoa oven and fermentation facility	GP	573 673 152	OIVDP/ITB-CCTB(GP)	ONIT	12/07/2021	24/09/2021	25/10/2021	04/11/2021	02/02/2022
18	Project Management of Supply of Cocoa oven and fermentation facility	ISC	57 367 316	OIVDP/ITB-CCTB(GP)	RNIT	01/07/2021	09/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	17/02/2022
19	Supply of cassava processing units	GP	446 316 480	OIVDP/ITB-CCTB(GP)	ONIT	23/08/2021	05/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	16/03/2022
20	Provision of palm oil motorized units	GP	669 475 008	OIVDP/ITB-CCTB(GP)	ONIT	12/04/2021	25/06/2021	26/07/2021	05/08/2021	03/11/2021
21	Supply of M and E Software	GP	10 711 600	OIVDP/ITB	RQ	17/06/2021	12/07/2021	29/07/2021	09/08/2021	08/11/2021
22	Construction of 70KM feeder roads	ROAD	1 499 623 936	OIVDP/ITB	ONIT	30/09/2021	29/11/2021	31/12/2021	10/01/2022	10/01/2023
TOTAL			14 257 990 805							
